



नेपाल सरकार

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

सिंहदरवार, काठमाडौं

गोरखा जिल्लाको वर्तमान अवस्थाको प्रस्तुतीकरण Seminar on Sustainable recovery

दिव्यराज पोखरेल

शाखा प्रमुख, बै.स.स. शाखा

२०७५ माघ ६


प्रस्तुतीकरणका मुख्य विषयहरु

- निजी आवास अनुदान वितरण
- गुनासो ब्यवस्थापन
- सडकहरुको पुनर्निमाण
- जोखिमयुक्त वस्तीहरुको स्थानान्तरण
- खर्च विवरण
- निजी आवास अनुदान वितरणको समयसिमा
- राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट भएका प्रमुख कार्यहरु

નિજી આવાસ અનુદાન

સિ.નં.	વિવરણ		આ.વ. ૨૦૭૫/૭૬ પૌષ મસાન્ત સમ્મ	પ્રતિશત
૧	જમ્મા લાભગ્રાહી		૬૫૪૯૫	
૨	અનુદાન સમ્જૌતા		૬૩૨૫૦	૯૭
૩	પ્રથમ કિસ્તા ભુક્તાની		૬૨૩૦૦	૯૮
૪	નિર્માણ કાર્ય શુરુ ભણકા ઘર સંખ્યા		૫૬૯૭૭	૯૧
૫	દોસ્રો કિસ્તા	માગ	૫૪૯૦૯	૯૬
		પ્રમાણિકરણ	૫૪૭૯૭	૯૯
		ભુક્તાની	૫૨૮૩૩	૯૬
૬	તેસ્રો કિસ્તા	માગ	૪૩૯૦૭	૮૩
		પ્રમાણિકરણ	૪૩૮૧૭	૯૯
		ભુક્તાની	૪૧૧૩૮	૯૩
૭	નિર્માણ સમ્પન્ન ઘર સંખ્યા		૩૫૫૪૮	૫૪
૮	પ્રવલીકરણ	લાભગ્રાહી	૫૦૩૩	
		સમ્જૌતા	૧૩૪૫	૨૬
		પ્રથમ કિસ્તા ભુક્તાની	૭૪૮	૫૫

२०७५ पौष मसान्त सम्म अनुदान वितरणको प्रगति

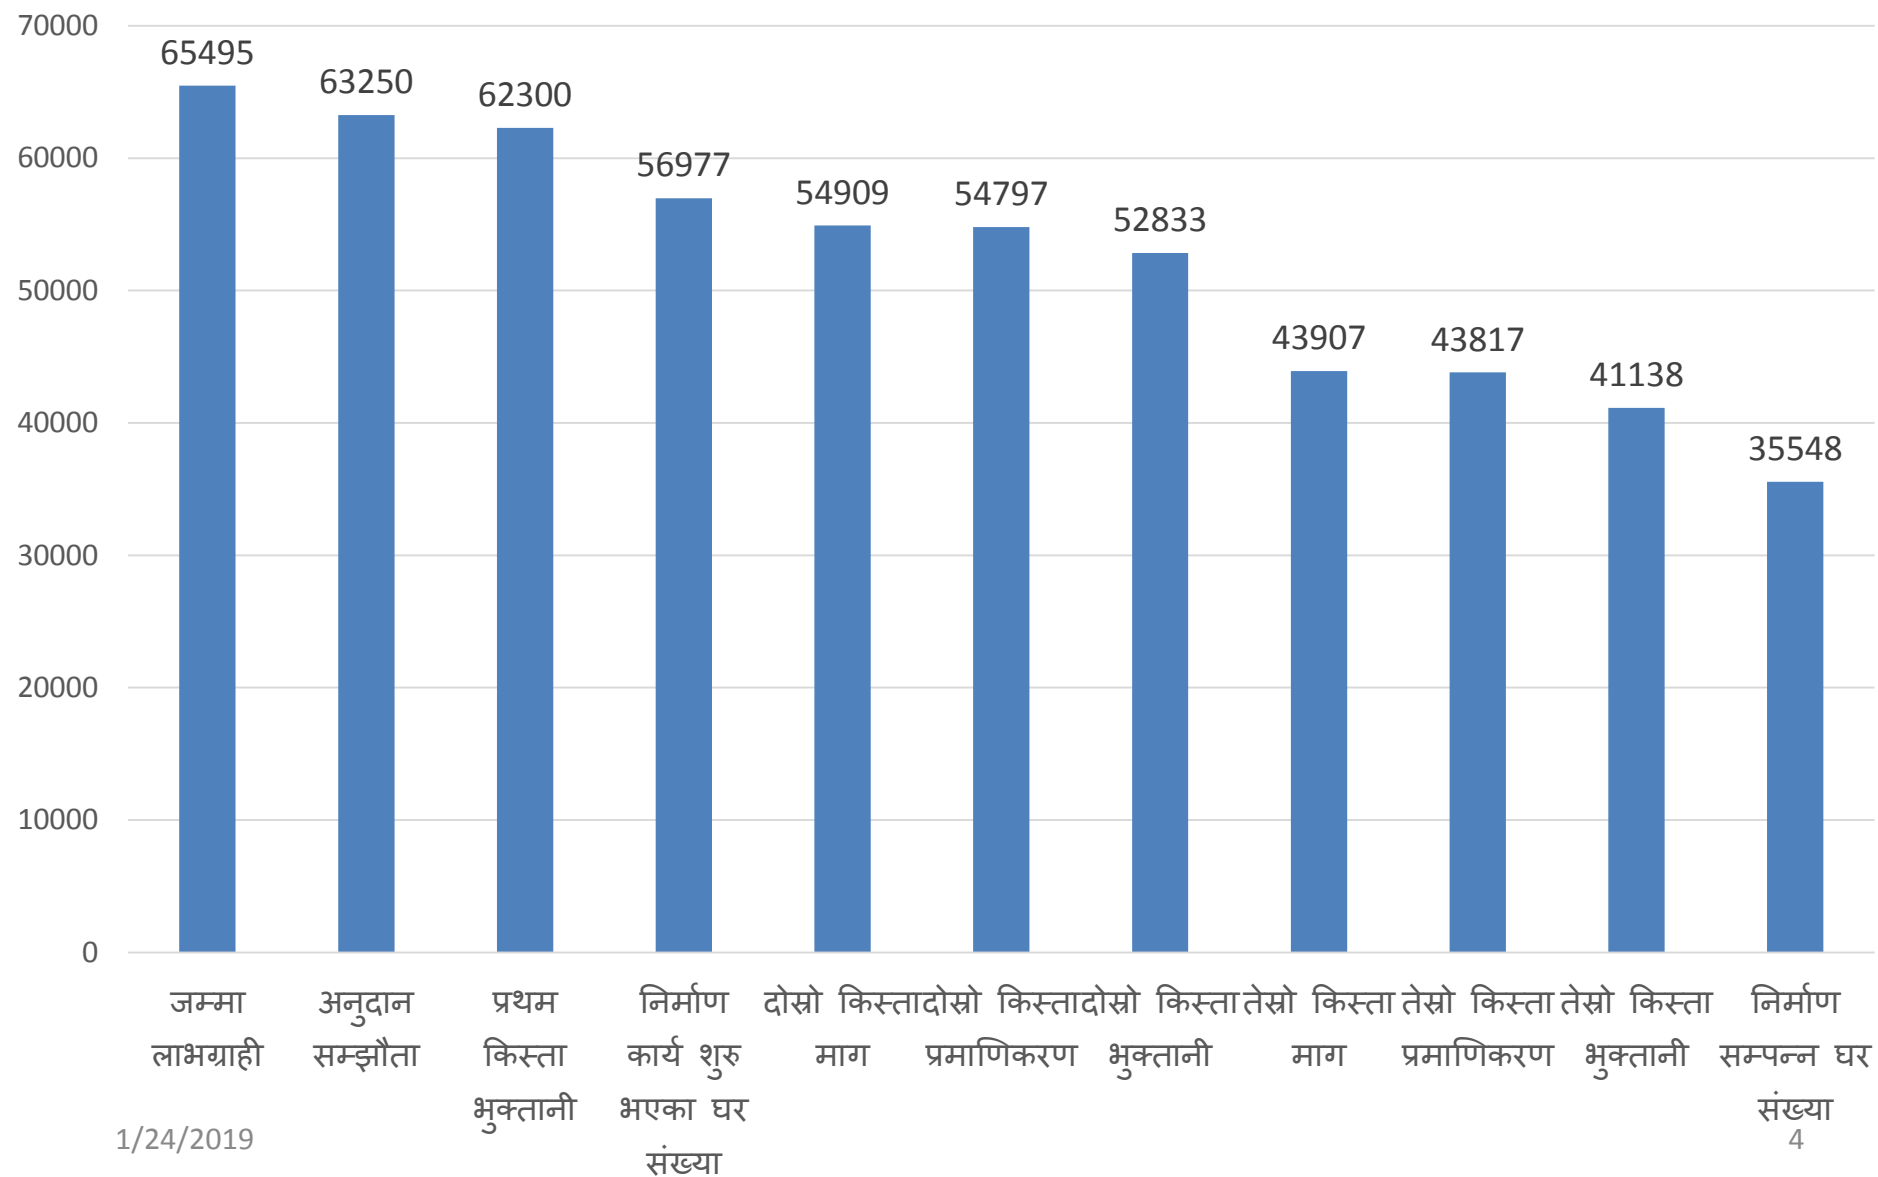

गुनासो व्यवस्थापन

चरण	गुनासो दर्ता संख्या	गुनासो पुनरावलोकन	पुनर्निर्माण लाभग्राही	प्रवर्तीकरण लाभग्राही
पहिलो चरणको गुनासो	१७५५५	१६६२२	२८१३	२०१९
पुनः सर्भक्षण तथा पुन जाँच	११४७१	११४७१	४२५१	२९३०
दोस्रो चरणको गुनासो	२२५६	२२४१	११६	१०४

सडकहरुको पुनर्निर्माण
(रणनितिक सडक-सडक विभाग)
ADB को सहयोगमा संचालित

सिन	सडकको नाम	जिल्ला	लम्बाई (km)
१	प्याकेज ३	गोरखा	१०.२
	प्याकेज ४	गोरखा	५.२

जोखिमयुक्त स्थानबाट सुरक्षित स्थानमा बस्ती स्थानान्तरणको प्रगति

सि.नं.	विवरण	संख्या
१	रु. दुई लाख अनुदान लिई जग्गा व्यवस्थापन गरेका लाभग्राहीको संख्या	४२

खर्च विवरण

रु. हजारमा

सि.नं.	बजेट उप शीर्षक	अख्तियारी रकम	खर्च	खर्च %
1	जिल्ला आयोजना इकाई (भवन)	८५६२६९	१६५१८४	१९.२९
2	अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानिय पूर्वाधार	५५७३३९४	१७०८५६९	३०.६६
3	जिल्ला आयोजना इकाई (शिक्षा)	१०८४४६५	१७६६५९	१६.२९
4	जिल्ला प्रहरी कार्यालय	३८९३६	११९७३	३०.७५
जम्मा		७५५३०६४	२०६२३८५	२७.३१

निजि आवास पुनर्निमाण अनुदानको किस्ता लिइसक्नुपर्ने समयसीमा

1. २०७५ असार मसान्तसम्म पहिलो किस्ता प्राप्त गरिसकेका लाभग्राहिका लागि
 - दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्नुपर्ने अवधि २०७५ पौष मसान्त
 - तेस्रो किस्ता प्राप्त गर्नुपर्ने अवधि २०७६ बैशाख मसान्त
२. पहिलो किस्ता समेत प्राप्त गर्न बाँकी लाभग्राहिको लागि
 - अनुदान सम्झौता सम्पन्न गरि प्रथम किस्ता लिइसक्नुपर्ने २०७५ कार्तिक समान्त
 - दोस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने २०७५ माघ मसान्त
 - तेस्रो किस्ता लिनुपर्ने २०७६ जेठ मसान्त

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट भएका प्रमुख कार्यहरु

- गोरखा दरबार क्षेत्रलाई परम्परागत सम्पदा बस्तीका रुपमा सूचिकृत गरी पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाइएको ।
- गोरखा एवं सिन्धुपाल्चोकमा भूकम्प स्मृति पार्कहरुको पुनर्निर्माण गर्ने ।
- भूकम्प सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय स्तरको म्युजियम तथा अनुसन्धान केन्द्र बारपाकमा स्थापनासम्बन्धी गृहकार्य अघि बढाइएको ।
- प्राधिकरणमा हाल रहेको सुचना प्रणालीलाई सङ्घ प्रदेश र स्थानिय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको ।
- गुनासो सम्बोधनको लागि पुनः जाँच तथा पुनः सर्भेक्षण संचालनको तयारी ।
- भूकम्प प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह र प्राधिकरण बिचमा पुनर्निर्माण सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको
- सहलियतपूर्व ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ भाद्र २१ मा मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भए अनुसार आर्थिक अभावका कारण हालसम्म घर निर्माण शुरु नगर्ने भूकम्प पीडितहरुलाई रु. ३ लाख ऋण ब्याज अनुदानमा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।

धन्यवाद!!!
