

PROYECTO DE REACTIVACIÓN DEL “PROYECTO DE RIEGO Y DRENAJE DE LA CUENCA DEL RÍO CATARAMA”

PRORRICAT

NO.15 Noviembre del 2014



ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE


- Cosecha de las parcelas experimentales y demostrativas en el área del proyecto.
- Monitoreo de los cultivos que se siguen desarrollando en el área objeto del proyecto
- Reuniones quincenales con los agricultores del área modelo en Subjunta 12.
- Demostración de uso e instalación de sifón en área modelo.
- Monitoreo de pequeños huertos comunitarios instalados en las subjuntas del Sistema de Riego

AREA DE TECNOLOGIA DE CULTIVO

SEMBRADORA DE TAMBOR

Tenemos resultados de prueba de sembradora de tambor. Obtenemos la cantidad de 7,15 t/Ha (78,69 sacas/Ha) o 5,04 t/cuadra (55,52 sacas/cuadra).

Se realizó su análisis económico, donde presentamos en gráfico. Hay una tendencia aplicando gestión de alquiler de terreno y mano de obra con un costo de (1433 dólares) con un ingreso neto de 1321 dólares a diferencia en gestión sin alquiler de terreno con mano de trabajo de familia con un costo de (1015 dólares), donde sube el ingreso neto a 1739 dólares. Ya que existe ventaja de siembra de usar menos semillas y menos mano de obra, además mejor desarrollo de plantas por menos competencia de nutrientes. Vamos a presentar en seminario PRORRICAT, mas resultados sobre el desarrollo de máquina de tambor LOS RIOS e informes de resultados de parcelas experimentales.

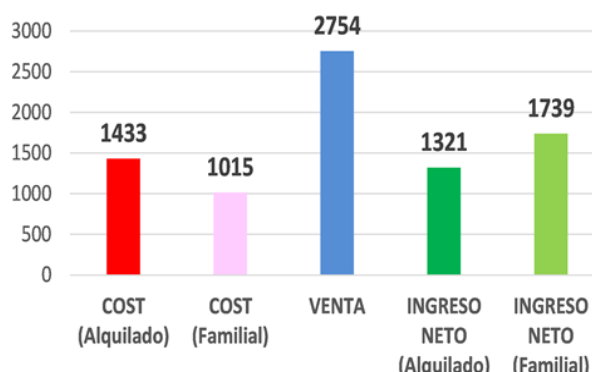

SIMULACIÓN ECONOMICO DE CULTIVO
ARROZ EN VERANO CON SEMBRADOR
TAMBOR

AREA DE GESTION AGRICOLA

Venta de nuestros vegetales

En nuestras parcelas experimentales estamos cosechando vegetales, les hemos vendido la cosecha directamente a los consumidores.

Los consumidores estuvieron interesados en los productos que vendíamos.




AREA DE TECNOLOGIA DE RIEGO

- Dos reuniones con los agricultores del Área Modelo, octubre 9 y 23.
- 4 semanas de monitoreo del riego en el Área Modelo


Resultados:

Los agricultores del Área Modelo:

- Aplican el método de riego por requerimiento.
- No manipulan las compuertas de los canales secundarios.
- Respetan sus turnos de riego.
- Llegan a acuerdos para un correcto manejo de la red de canales terciarios parcelarios.
- Conocen el manejo del sifón de PVC.

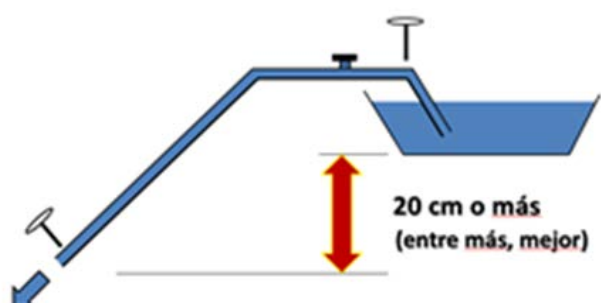

Asegurese que haya al menos 20 cm de diferencia entre la base del canal y la parcela

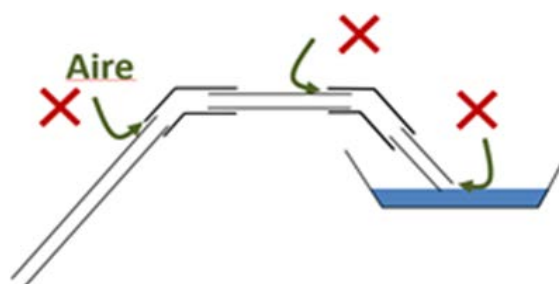

Selle las uniones herméticamente y asegurese que el sifón esté sumergido lo suficiente para evitar el ingreso de aire

ACTIVIDADES FUTURAS

Dentro de las actividades futuras del proyecto tenemos:

- Segunda reunión del CCC (Comité de Coordinación Conjunta) el 19 de noviembre del 2014.
- Ultimo Seminario PRORRICAT 2014, con temas que serán de beneficio total para el agricultor.
- Formación de pequeños grupos alrededor de las parcelas demostrativas para instalar y promover el Plan Modelo de Agricultura con Riego en Subjunta 12.
- Cosecha de arroz en parcela experimental de Sibimbe 2.
- Instalación de Sifón en terrenos del área modelo en subjunta 12
- Monitoreo del correcto uso y manejo del Sistema de Riego en las parcelas experimentales del proyecto.

ATENCION

Por remodelación de nuestras oficinas encuétranos en el segundo piso de las oficinas del GAD Municipal de Pueblo Viejo



URL de Blog de PRORRICAT:
prorricat.blogspot.com

PRORRICAT: Proyecto de Reactivación del Proyecto de Riego y Drenaje de la Cuenca del Río Catarama

Oficina: Oficinas del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pueblo Viejo

Dirección: Calle Miguel Suárez Seminario y Fermín Chávez, Pueblo Viejo, Los Ríos

Correo electrónico: prorricat.ecuador@yahoo.com

Teléfono: 0968090285
