【工事名称：2019年 JICA北海道(札幌)配管設備・ポンプ等更新工事】

【概略工事工程表】

'190422作成

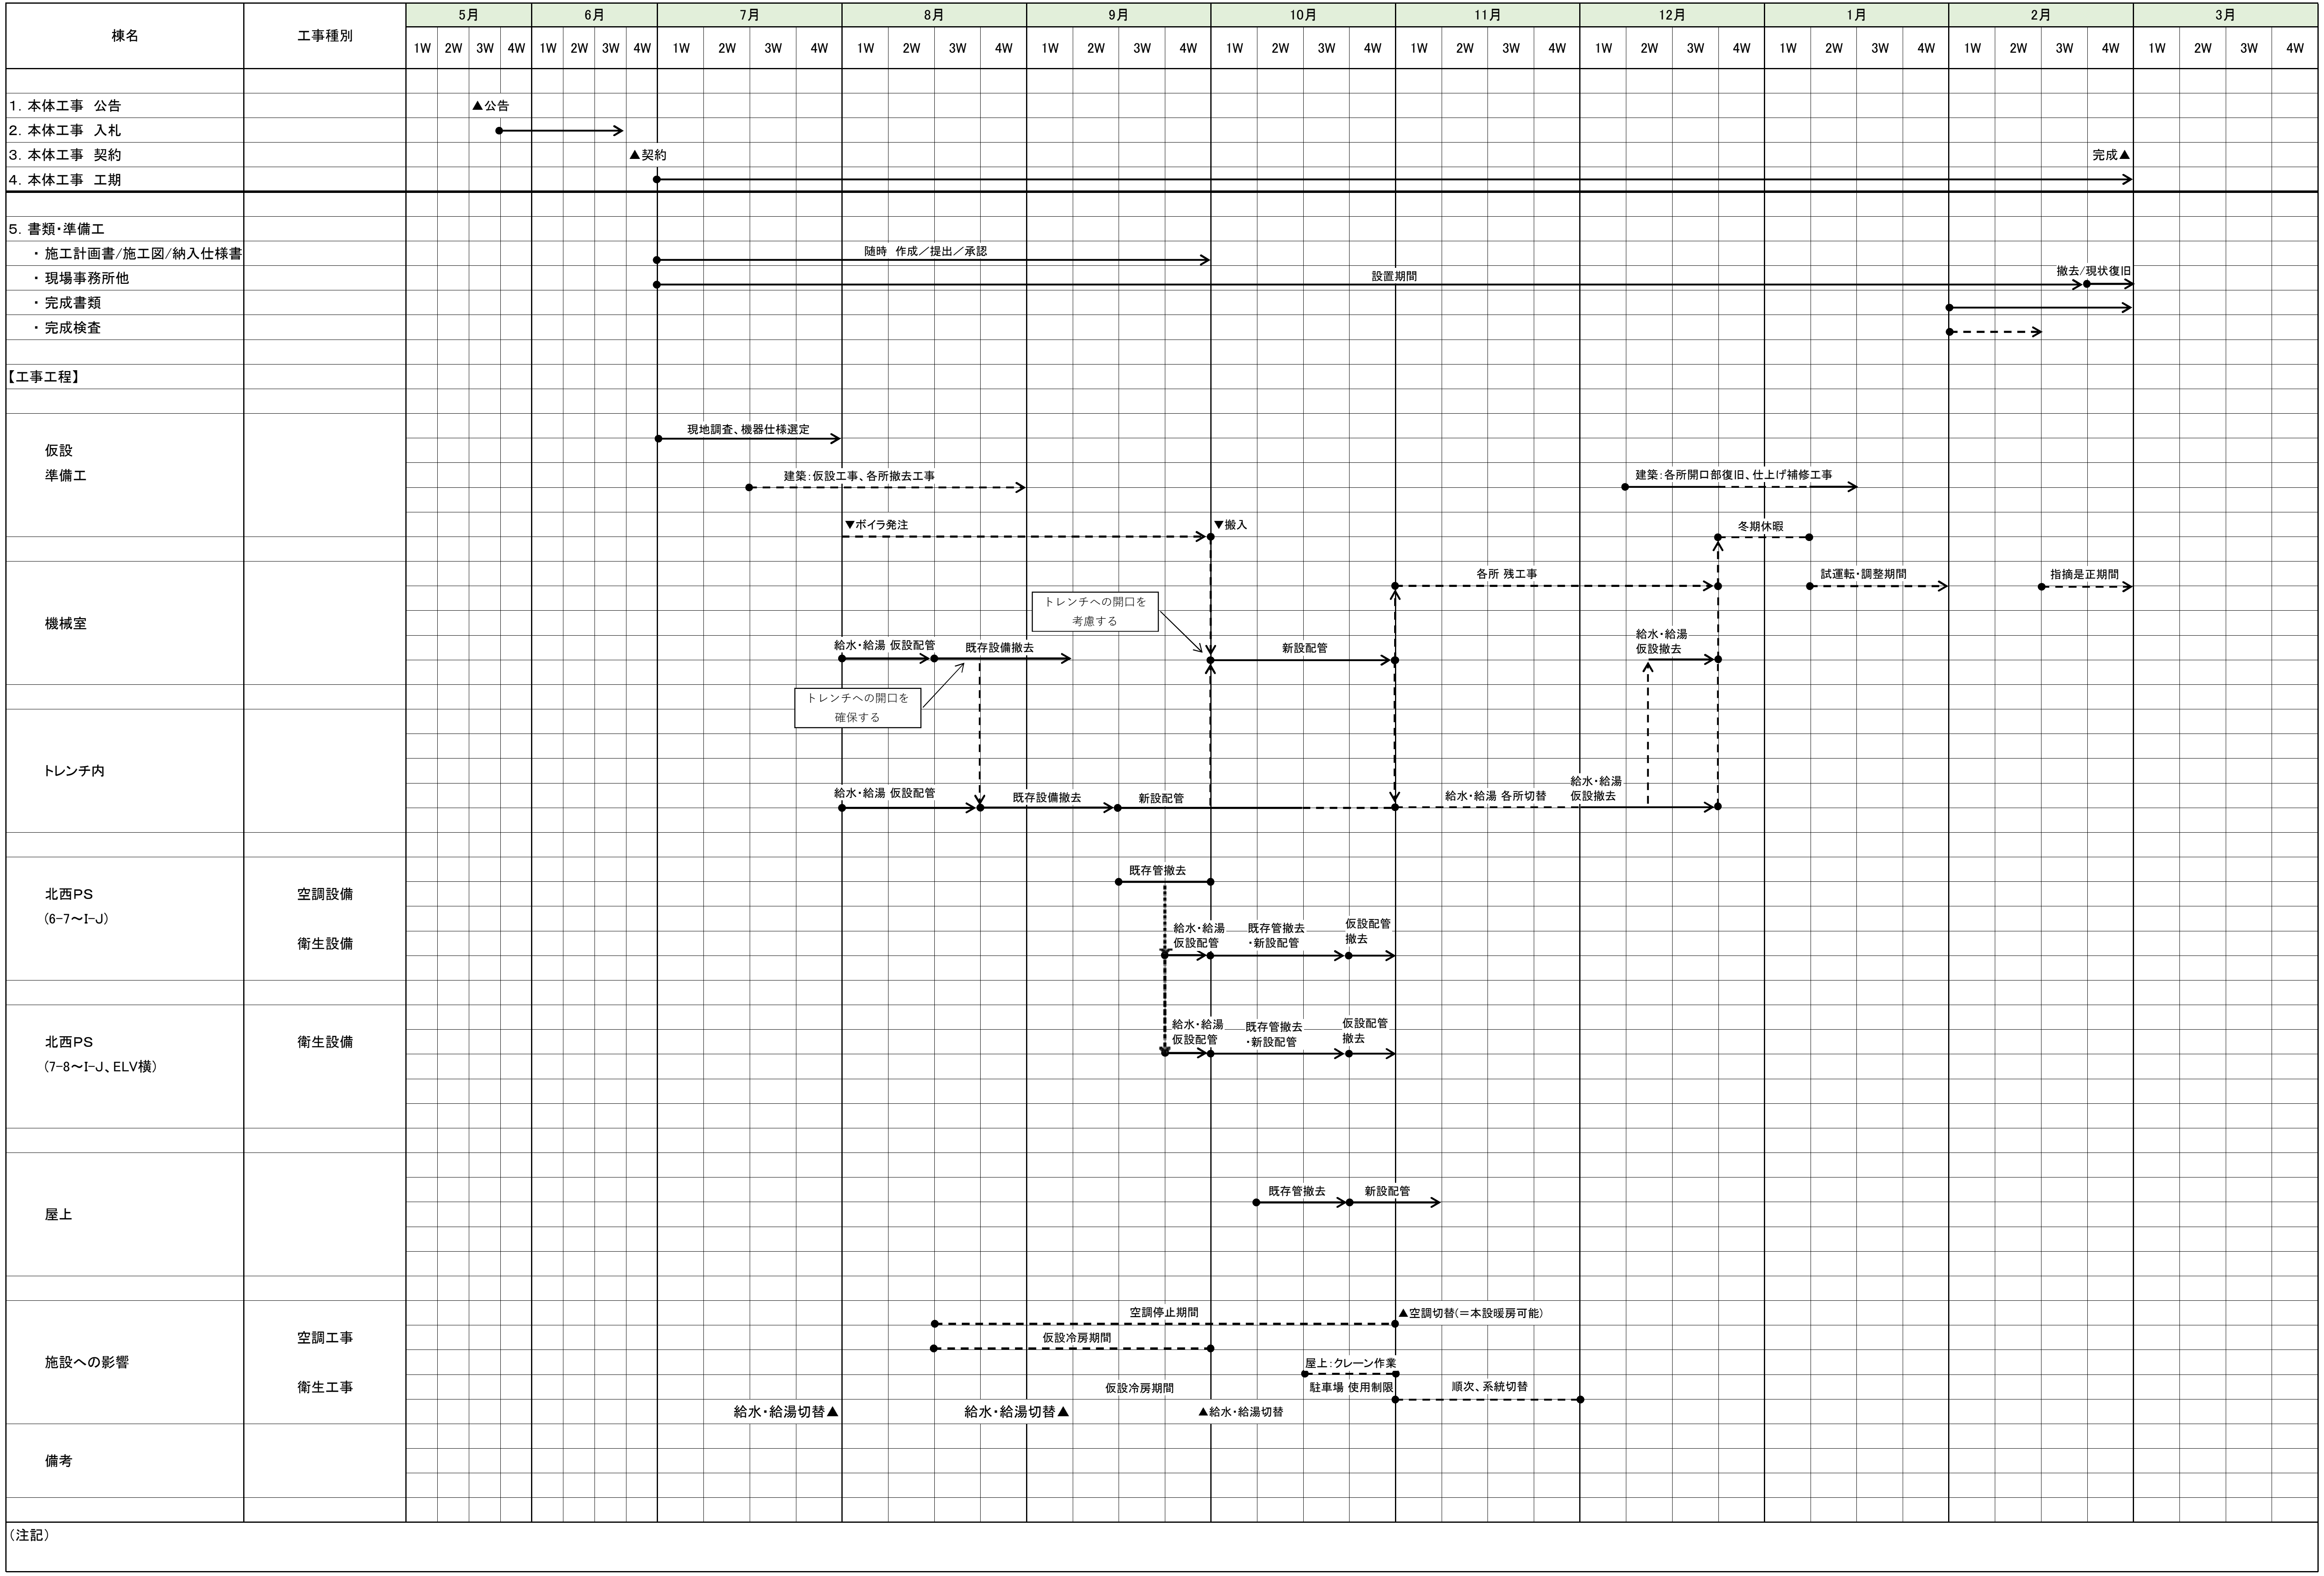
棟名
工事種別
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
1W
2W
3W
4W
1. 本体工事　公告
2. 本体工事　入札
3. 本体工事　契約
4. 本体工事　工期
▲公告
▲契約
完成▲
5. 書類・準備工
・施工計画書/施工図/納入仕様書
・現場事務所他
・完成書類
・完成検査
随時　作成／提出／承認
設置期間
撤去/現状復旧
【工事工程】
仮設
準備工
現地調査、機器仕様選定
建築：仮設工事、各所撤去工事
建築：各所開口部復旧、仕上げ補修工事
▼ボイラ発注
▼搬入
冬期休暇
機械室
各所 残工事
試運転・調整期間
指摘是正期間
トレンチへの開口を
考慮する
給水・給湯 仮設配管
既存設備撤去
新設配管
給水・給湯
仮設撤去
トレンチへの開口を
確保する
トレンチ内
給水・給湯 仮設配管
既存設備撤去
新設配管
給水・給湯 各所切替
給水・給湯
仮設撤去
北西PS
(6-7～I-J)
空調設備
衛生設備
既存管撤去
給水・給湯
仮設配管
既存管撤去
・新設配管
仮設配管
撤去
北西PS
(7-8～I-J、ELV横)
衛生設備
給水・給湯
仮設配管
既存管撤去
・新設配管
仮設配管
撤去
屋上
既存管撤去
新設配管
施設への影響
空調工事
衛生工事
空調停止期間
▲空調切替(＝本設暖房可能)
仮設冷房期間
屋上：クレーン作業
駐車場 使用制限
仮設冷房期間
順次、系統切替
給水・給湯切替▲
給水・給湯切替▲
▲給水・給湯切替
備考
(注記)
