


【配管・ポンプ等更新工事】※工事部分の工程詳細は参考とし、受注者が現地調査・発注者との協議の上で作成すること。

別添A

【概略工事工程表】

'1910作成

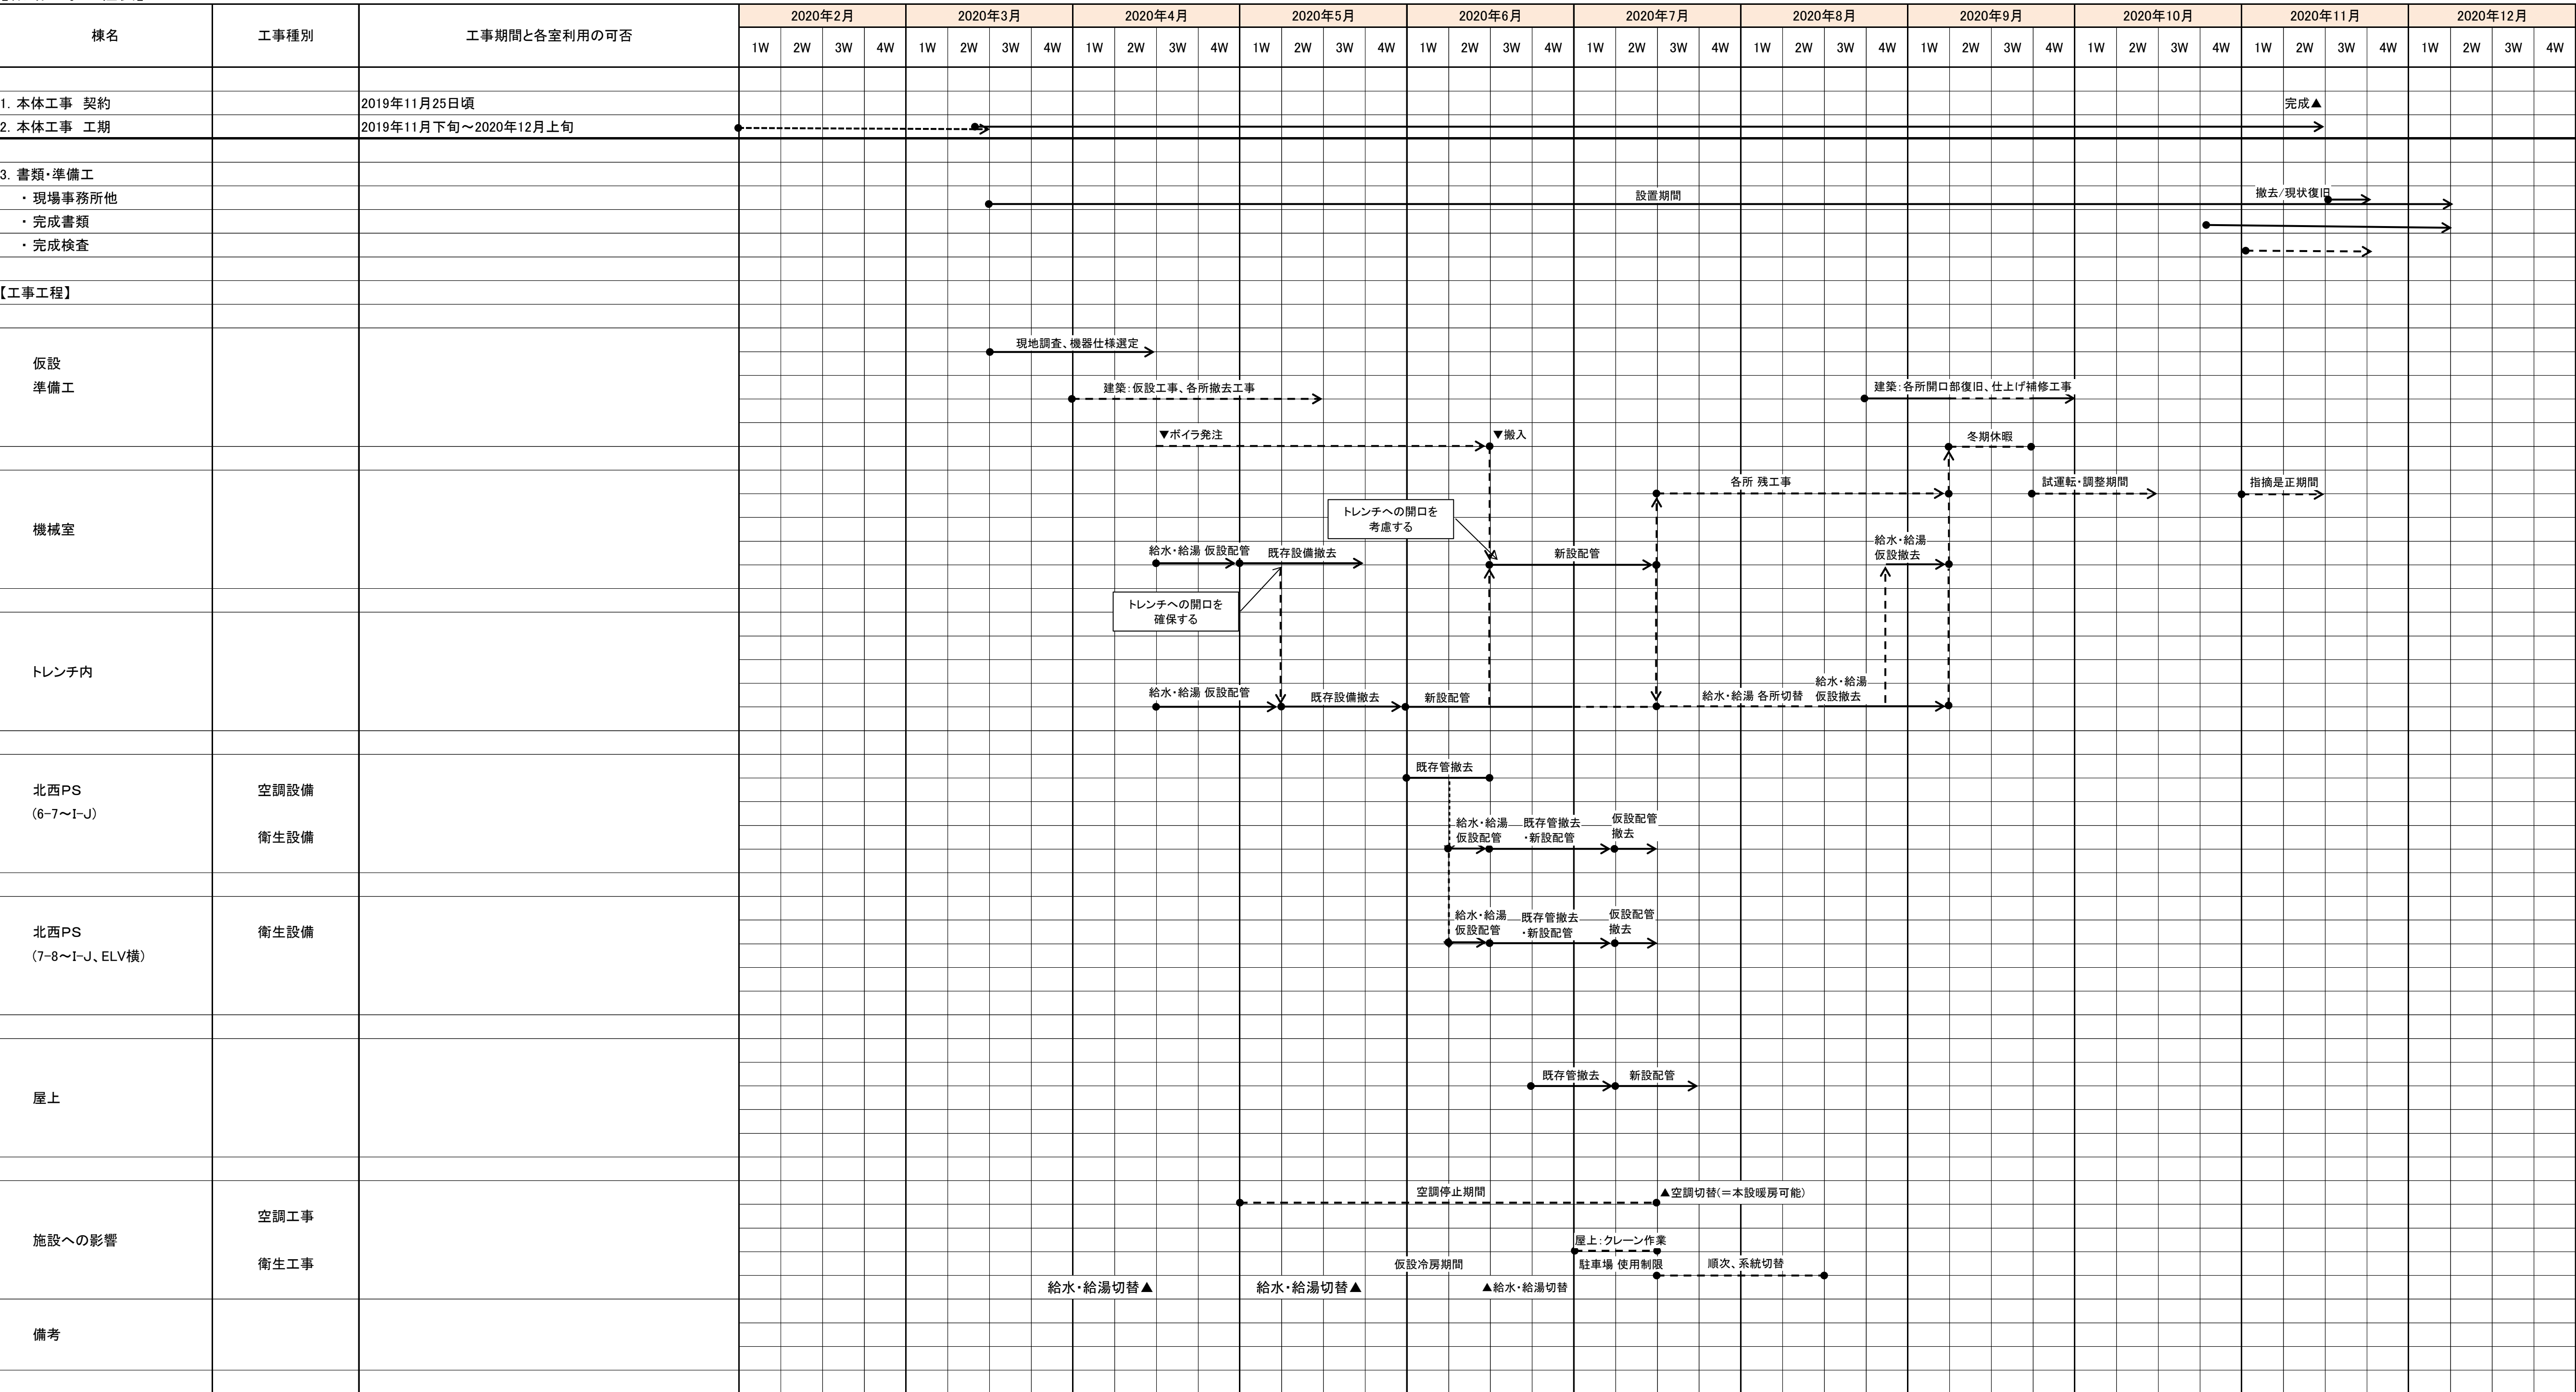

(注記)

※1 本工事は居ながらの工事を前提としているため、工事期間中は調整が必要となる場合もあることから、受注者は発注者および監督員と定期的な打ち合わせを行い、施設に影響のある作業が予定されている場合は、詳細な工程を示して承認を得ること。

※2 冷暖房や給水・給湯の停止期間は概略工事工程表に示す期間内とし、可能な限り施設への影響を最小限に抑えるよう努めること。

※3 給水・給湯の切替作業は、事前に建物管理者の了解を得てから着手すること。

※4 客室FCUおよび空調配管の更新工事と同時進行で工事を行うこと。

【ファンコイルユニット更新工事】※工事部分の工程詳細は参考とし、受注者が現地調査・発注者との協議の上で作成すること。

【概略工事工程表】

棟名・工事種別	予定期間と各室利用の可否	2019年10月				2019年11月				2019年12月				2020年1月				2020年2月				2020年3月				2020年4月				2020年5月				2020年6月			
		1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W
1.本体工事 契約	2019年11月25日頃																																				
2.本体工事	2019年11月下旬～2020年月下旬# (※2020年3月下旬までにファンコイルユニット納品)																																				
ファンコイルユニット・冷温水配管の撤去・新設 宿泊室 南側系統(工事概略図02参照)	2020年4月1週～5月4週工事実施 以下の室を工事のため利用休止とする。※1 ※2 2階: セミナールーム(3)(4)(5)(6)(7)(8) 3階: 309～322号室 4階: 411～424号室 5階: 510～523号室																																				
ファンコイルユニット・冷温水配管の撤去・新設 宿泊室 西側系統(工事概略図02参照)	2020年6月1週～7月2週工事実施 以下の室を工事のため利用休止とする。※1 ※2 2階: セミナールーム(1)(2)(10)・講師控室・準備室・宿泊室側便所 3階: 323～330号室・タイプ室・洗濯室 4階: 425～434号室・トランク室・洗濯室 5階: 524～533号室・洗濯室																																				
下段へ続く																																					
棟名・工事種別	予定期間と各室利用の可否	2020年7月				2020年8月				2020年9月				2020年10月				2020年11月				2020年12月				2021年1月				2021年2月				2021年3月			
2.本体工事	2019年11月下旬～2020年12月上旬(※2020年3月下旬までにファンコイルユニット納品)																																				
上段から続き	2020年6月1週～7月2週工事実施 以下の室を工事のため利用休止とする。※1 ※2 2階: セミナールーム(1)(2)(10)・講師控室・準備室・宿泊室側便所 3階: 323～330号室・タイプ室・洗濯室 4階: 425～434号室・トランク室・洗濯室 5階: 524～533号室・洗濯室																																				
ファンコイルユニット・冷温水配管の撤去・新設 宿泊室 西側系統(工事概略図02参照)																																					
ファンコイルユニット・冷温水配管の撤去・新設 宿泊室 東側系統(工事概略図02参照)	2020年7月3週～8月1週工事実施 以下の室を工事のため利用休止とする。※1 ※2 2階: セミナールーム(9)・自動販売機前通路・パソコンルーム・エントランスホール上部 3階: 305～307号室・コモンキッチン 4階: 405～410号室 5階: 505～509号室																																				
ファンコイルユニット・冷温水配管の撤去・新設 宿泊室 北側系統(工事概略図02参照)	2020年8月2週～8月4週工事実施 以下の室を工事のため利用休止とする。※1 ※2 2階: オリエンテーションルーム 3階: 301～304号室 4階: 401～404号室 5階: 501～504号室																																				

- ※1 他室についても期間中に利用休止、冷暖房停止、養生となる場合は反映すること。
- ※2 施設の運営上利用休止が困難な室については期間内にて居ながら工事を計画すること。
- ※3 JICA北海道(札幌)配管設備・ポンプ等更新工事と同時進行で工事を行うこと。
- # 完成予定日は2020年度の財源措置がなされた段階で契約を変更し延長する。
