

Planu Servisu  
ba  
Projetu Jestaun Rekursu Natural Bazeia ba Komunidade  
ne'ebe Sustentavel  
Faze II

Outubro, 2016

International Development Center of Japan Inc.

Nippon Koei Co., LTD



**Planu Servisu**  
**Tabela de Kontiudu**

1.	Introdusaun.....	1
1.1	Fundamentu.....	1
1.2	Kuadru Servisu hosi Estudu .....	1
2.	Politika Baziku ba Atinji Objetivu Projeto no Resultadu.....	3
3.	Metodo Applika ba Atividade Projeto .....	8
3.1	Lina jerl no Lalaok Servisu hosi Atividade .....	8
3.2	Atividade ba Jestaun em Jeral .....	8
3.3	Atividade ba Resultadu 1 .....	10
3.4	Atividade ba Rezutadu 2 .....	13
3.5	Atividade ba Resultado 3 .....	16
3.6	Horariu Servisu .....	22
4.	Equipamentu nebe atu hola .....	22
5.	Relatoriu no Dokumentu seluk nebe sei produs.....	23

## Abreviasaun no Acronim

C/P	Counterpart/ Parceiro
CB-NRM	Community based sustainable Natural Resources Management/ Jestaun Rekursu Natural Sustentabel Baseia ba Komunidade
CFMA	Community Forest Management Agreement/ Akordu Jestaun Floresta Komunidade
DFAT	(Australia)Department of Foreign Affairs and Trade
DP	Development Partner/Parceiru Desenvolvementu
EU	European Union/Uniao Europeia
FAO	Food and Agriculture Organization
GCCA	Global Climate Change Alliance Program
GIZ	Deutsche Gesellschaft fur International Zusammenarbeit
GoJ	Government of Japan/ Governo Japaun
GoTL	Government of Timor Leste/ Governo Republica Democratica de Timor-Leste
HASATIL	Hametin Agrikultura Sustentavel Timor
JCC	Joint Coordination Committee
JICA	Japan International Cooperation Agency
MAF	Ministry of Agriculture and Fisheries
MP	Micro Program
NDFWM	National Directorate for Forestry and Watershed Management/ Diresaun Nasional Floresta no Jestaun Bacias Hidrografikas
NDNC	National Directorate for Nature Conservation/ Diresaun Nasional Conservasaun Natureja
NGO	Non-government Organizations/Orgnijasau non governmentais
OJT	On the job training
PDM	Project Design Matrix
PLUP	Participatory Land Use Planning
PNDS	Programa Nasional desenvolvimento Suku/ National Program for Village Development
R/D	Rekor of Discussion
RDP	Rural Development Program/Programa Desenvolvimento Rural
TOMAK	Toos ba Moris Diak/Farming for Prosperity
UNDP	United Nations Development Programme
USAID	U.S Agency for International Development

# 1. Introdusaun

## 1.1 Fundamentu

Assesmentu ikus ne'ebe halo hatudu katak, pelumenus 13,000 hectares ailaran lakon ona entre tinan 2003 no 2012 no pelumenus 171,00 ha hosi ailaran tuan hetan ona estraga hodi sai ailaran uituan durante periodo ne'ebe hanesan. Assesmentu ne'ebe hanesan mos indika katak total kobertura ailaran deklina ka menus ona pelumenus 59% iha nasaun laran (pelumenus 869,000 ha) iha 2012.

Iha kondisaun ka sirkumtansia ida ne'e, Governo Republica Democratica de Timor-Leste (GoTL) konkorda ho Japan International Corporation Agency (JICA) hodi halao estudu dezvoltimentu ida ho naran "Estudu ba Jestaun Bacias hidrograficas Integradu Bazeia ba Komunidade iha Mota inan Comoro no Laclo" iha 2004. Rezultadu hosi estudu ne'e mak planu jestaun rekursu natural integradu bazeia ba komunidade ba mota inan rua ne'ebe mensiona iha leten no matadalan planemanetu jestaun bacias hidrograficas bele dezvoltolve no submete ba GoTL.

Depois de estudu dezvoltimentu ne'e, GoTL no JICA halao "Projetu ba Jestaun Rekursu Natural Sustentavel Bazeia ba Komunidade (2010 – 2015)." Iha projetu ida ne'e, modelu mekanismu ida hosi jestaun rekursu natural sustetavel bazeia ba komunidade (CB-NRM) bele dezvoltolve ona, no mekanismu ida nee introdus iha suku nen (6) iha mota inan rua Laclo no Comoro.

Atu hasae mekanismu CB-NRM, GoTL husu ba governo Japaun (GoJ) ba implementasau Kooperasaun Tekniku Adisionadu, Projetu ne'e ba promosaun no haforsa Jestaun Rekursu Natural Sustentavel Bazeia ba Komunidade. Responde ba pedidu ofisial hosi GoTL, JICA halo Detallu Planu Survey no halao diskusaun lubun ho Diresaun Nasional Floresta no Jestaun Bacias Hidrograficas (DNFGH) no organizasaun relevante sira seluk hodi dezvoltolve Deskrisaun Projetu ne'ebe Mensiona iha Leten. Minutas Diskusaun ka Record of Discussion (RD) Kooperasaun ba implementasaun projetu mensiona iha leten asina iha 18 Febreiru 2016.

## 1.2 Kuadru Servisu hosi Estudu

Kuadru Servisu atual hosi Projetu ne'e (ez. Lina jeral hosi Matrix Dezeñu Projetu: PDM) rezumu iha Tabela 1.

**Tabela1 Kuadru Servisu Projetu (Lina Jeral PDM)**

Sumariu Narativu	Indikador Verifika Objektivu
Meta Jeral : Mekanismu Jestaun Rekursu Natural Bazeia ba Komunidade (CB-NRM) habelar ba bacias hidrograficas seluk alinha ka iha konkordansia ho mapa servisu	Mekanismu CB-NRM implementa iha XX bacias hidrograficas tuir konkordansia ho mapa servisu to'o tinan 20XX*
Objetivu Projetu : Hametin kapasidade hosi autor operacional prinsipal sira inklui DNFGBH, ONG no parseiru sira seluk hodi habelar mekanismu	1. Atividade tarjetu ba mota inan Laclo no Comoro alinha ho mapa servisu implementa tuir planu ne'ebe iha ona. 2. Pelumenus XX% hosi autor operacional prinsipal sira hetan treinu hosi Projetu hola parte iha implementasaun mekanismu CB-NRM iha

	terrenu projetu nian no/ka iha bacias hidrograficas seluk 3. Insidente sira hosi eventu ne'ebe kauza degradasaun floresta redus tuir observasaun hosi lider suku sira iha fatin projetu.
Rezultadu 1 : Mapa servisu ba futuru espansaun hosi mekanismu CB-NRM formula ona.	1-1. Koluna vertebra Kuadru servisu hosi mapa servisu formuladu alinha ho politika no programa relevante sira seluk. 1-2. ne'e aprova ona hosi Ministerio Agricultura e Pescas (MAP))
Rezultadu 2 : Ambiente ne'ebe forte dezenvolve ona hodi hametin institusaun relevante sira ba espansaun mekanismu CB-NRM	2-1. Pakote foun ida hosi rekomendasaun politika formuladu ona bazeia ba rezultadu hosi monitorizasaun ba implementasaun mekanismu CB-NRM hosi DNFGBH 2-2. Enkontru/ atividade troka informasaun entre parseiru sira no autor operacional prinsipal sira regularmente halao pelumenus kada tinan rua liuhusi plataforma CB-NRM hodi promove CB-NRM 2-3. Lisaun aprende no pratika diak sira ne'ebe hetan liuhusi plataforma CB-NRM sei rai hanesan dokumentu referensia no fahe entre membru sira.
Rezultadu 3 : Kapacidade hosi autor operacional prinsipal sira inklui DNFGBH, ONG sira no parseiru sira seluk haforsa liu hosi involvmentu sira iha implementasaun mekanismu CB-NRM	3-1. Regulamentu suku ba CB-NRM formuladu iha suku hotu iha fatin projetu. 3-2. Pelumenus XX autor operacional prinsipal treinu ona hosi Projetu liuhusi implementasaun mekanismu CB-NRM hansen treinamentu pratik direktamente iha fatinn servisu (OJT)
<p><b>Atividade atu atinji iha Resultadu 1:</b></p> <p>1-1 Identifika isu nebe atu diriji no medida nebe foti ba espansaun mekanismu CB-NRM iha bacias hidrografikas importante iha Timor-Leste.</p> <p>1-2 Desenvolve kuadru servisu hosi lalaok nebe iha atu habelar mekanismu CB-NRM.</p> <p>1-3 Haloosbosu kona planu assaun atu haluan mekanismu CB-NRM.</p> <p>1-4 Hetan akordu no approva official hosi MAP kona ba planu assaun.</p> <p><b>Atividade atu atinji resultadu 2:</b></p> <p>2-1 Facilita estabese sekretariadu iha MAP/DNFGBH iha koordinasaun ho rede nebe iha ona.</p> <p>2-2 Identifika parceiru no autor importante servisu iha area relevante ba iha CB-NRM.</p> <p>2-3 Assiste plataforma CB-NRM atu sensitija membro sira hosi plataforma kona ba mekanismu CB-NRM no troka informasaun egualmente no atu akumula lissaun nebe aprende no pratika diak</p> <p>2-4 Formula no halo rekomendasaun politika kona ba espansaun mekanismu CB-NRM.</p> <p><b>Atividade atu atinji resultadu 3:</b></p> <p>3-1 Facilita implementasaun mekanismu CB-NRM iha fatin projeto, tuir manual nebe desenvolve hosiProjeto ba Jestaun Rekursu Natural Sustentabel baseia ba comunidade.</p> <p>3-2 Facilita estabese no operasaun koncelho jestaun bacias hidrografikas iha fatin projeto</p> <p>3-3 Halao OJT ba autor operacional importante iha fatin projeto no iha fatin seluk liu hosi implementasaun mekanismu CB-NRM iha 3-1no 3-2 iha leten.</p>	

\*Numeru indikadores sei konfirma iha enkontru Komite Koordinasaun Konjuntu (JCC) iha fulan nen premeiru hosi inisiaun projetu.

<b>Durasaun:</b>	Augustu 2016, to'o Augustu 2020.
<b>Agencia Implementador:</b>	MAP/DNFGBH, no ONG
<b>Fatin Projetu:</b>	Suku nen (6) selesiona iha Mota inan Comoro no Lacro
<b>Grupus Tarjetu:</b>	Rezidencia local no agensia fasilitador seluk hanesan ONG

## 2. Politika Baziku ba Atinji Objetivu Projeto no Resultadu

Projeto estabese politika basiku lima ba ninia implementasaun mak hanesan tuir mai.

### Politika Baziku

- i. Integra interese paarseiru dezvoltimentu (DPs) iha MAP nia okos ba formulasaun
- ii. Asegura insetivu ba parseiru sira hodi participa iha plataforma ho fasilitasaun hosi sira nia komprensaun ba benefisiu hosi CB-NRM;
- iii. Konsidera papel diferente hosi autor sira iha implementasaun/hasae mekanismu CB-NRM no sira nia tarjetu dezvoltimentu kapasidade;
- iv. Fatin nebe efetivu hosi r mekanismu CB-NRM hodi halo espansaun
- v. Hametin politika ambiente ba espansaun mekanismu CB-NRM.

### Politika Baziku 1: Integra interese parseiru dezvoltimentu (DP) iha MAP nia okos ba formulasaun

Formuladu hosi Projeto sei sai hanesan tool/equipamentu ida MAP uza hodi maneja bacias hirgroaficas kritiku sira iha kooperasaun ho parseiru dezvoltimentu seluk. Atu dezvoltive hanesan ne'e kriteria mak prezensa hosi ofisial MAP nian ne'ebe hanesan nain, espesialmente sira ne'ebe hosi DNFGBH, ho komprensaun suficiente ba konteidu hosi no oinsa atu bele tau ba pratika. Ho konsidenrasaun ida ne'e Projeto sei uza tempu barak ba ofisial MAP no peritu JICA nian hamutuk halo servisu preparatoriu, e.z. assesmentu mekanismu CB-NRM (inklui rezultadu hosi projetu faze I), hare fali Politika Seitor Floresta, Lei Floresta no meius seluk ba justifikasaun legal hodi institucionalija mekanismu CB-NRM; no dezvoltimentu planu assaun kuadru. Servisu. Ida ne'e sei asegura sentimentu hanesan nain hosi Parte MAP nian.

Planu assaun sei kria ho referencia nebe diak ba iha politika agora no planu ba seitor, inklui planu Konservasaun Floresta (2012), Politika Seitor Floresta ne'ebe sei halo revizaun iha tinan 2017, Lei Floresta sei finalija.. nomos fasilidade projetu hosi mobilizasaun rekursu komprensivu iha kolaborasaun


ho parseiru dezvoltimentu oi-oin, liuhosi komprende sira nia planu ba intervensaun iha area tarjetu kritiku sira hanesan mensiona ona.



**Figura 2** Konseitu ba Mapa Servisu CB-NRM

**Política Basiku 2: Asegura Incentivu ba Parceiro sira atu participa iha plataforma ho facilitasaun hosi sira nia Komprensaun kona ba beneficiu hosi CB-NRM**

Projeto, liu hosi atividade ba Resultadu 2 iha PDM, nia objetivu atu estabelese plataforma nebe parceiro sira bele fahe konhesementu no informasaun ba implementasaun no hasae skalau CB-NRM. Atu estabelese mekanismu nebe efetivu no sustentabilidade, nee importante atu halo parceiro sira iha komprensaun nebe klaru kona ba resultadu nebe tau iha CB-NRM no mos atu fomese ba sira ho beneficiu atual (esemplu incentive) atu participa iha plataforma (Figura 3).

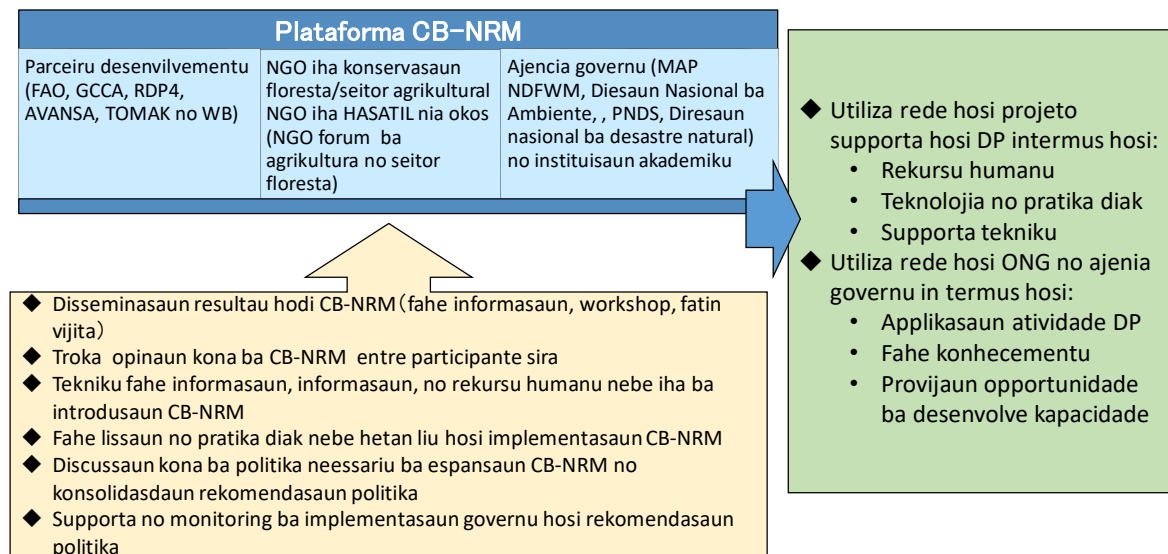

**Figura 3: Kuadru servisu no funsaun hosi plataforma CB-NRM**

Atu facilita komprensaun parceiru sira kona baCB-NRM, Projeto sei halao workshop/seminar balun atu fahe metodolojia no resultadu hosi CB-NRM ho parceiro sira iha preparasaun hosi estabesementu plataforma, Nomos, atu promove komprensaun iha nivel halo politika, Projeto sei hola parte iha revijaun hosi Politika Seitor Floresta, nebe sei assiste hosi FAO iha tinan ida nee. Iha servisu revijaun, iha ekipa servisu inklui oficiais hosi DNFGBH no parceiro importante seluk. Hanesan sira halo efetividade hosi CB-NRM no iha possibilidade habelar CB-NRM, Projeto sei introdus atividade importante no sira nia resultadu nebe halo hosi CB-NRM iha suku no sub bacias hidrografikas (esemplu Noru) nebe sai targetu iha Projeto fase 1, atu nune hetan komprensaun nebe klean kona potensial hosi CB-NRM

Ho respeita atu asegura incentivu projeto sei halo plataforma basiku ba fahe informasaun no konhecementu, nebe kontribui ba implementasaun hosi atividade nebe halao hosi varidade PD ba CB-NRM no/ou area nebe iha relasaun hanesan desenvolvimentu agrikultura no jestaun floresta. Plataforma sei desenha atu foo informasaun no servisu hanesan tuir mai, esemplu:

- Informasaun kona ba facilitador potensial/ONG ba CB-NRMno/ou atividade particiatoriu komunidadade
- Halo hamutuk entre parceiro sira atu facilita kooperasaun ba CB-NRMno/ou ativiidade particiatoriu



komunidade

- Introdusaun pratika diak no teknika diak ba CB-NRM no/ou atividade participatoriu komunidade
- Supporta tekniku ba implementasaun mekanismu CB-NRM
- Provijaun oportunidade treinamentu atu aprende tekniku nebe uja iha mekanismu CB-NRM

**Politika basiku 3: Konsidera funsaun diferente hosi autor sira iha implementasaun/skalau mekanismu CB-NRM no sira nia target hosi desenvolvimentu kapacidade**

Projeto sei kontinua ho desenvolve kapacidade hosi autor sira, responsabilidade ba sira nia funsaun diferente no responsabilidade iha implementasaun/skalau mekanismu CB-NRM hanesan tuir mai:

1) Treinamentu Facilitador maneija mekanismu CB-NRM

ONG mak autor importante iha implementasaun CB-NRM. Projeto sei identifika ONG nebe mak hakarak iha treinamentu ba sira nia membru staff sira atu sai facilitador ba atividade CB-NRM. Depois sei involve ONG nee iha implementasaun mekanismu CB-NRM iha nivel suku. Konkretu liu, atu halao atividade ba resultadu 3, Projeto sei halo sub kontratu ba ONG local nebe iha esperiencia suficiente hodi halao CB-NRM ou atividade hanesan. TOR hosi sub kontratu inklui OJT ba membro staff hosi ONG seluk nebe hakarak sai facilitador iha futuro. OJT sei halao durante tinan rua nia laran. Tinan premeiru atu treinu ema foun hanesan sub facilitador no halo sira hetan abilidade importante hodi halao mekanismu CB-NRM. Ba tinan segundu, membro sira sei servisu hanesan facilitador premeiru no bele hasae liu tan sira nia kapacidade ba maneija mekanismu.

2) Treinamentu ba staff tekniku iha implementasaun programa mikro

Projeto sei involve laos det facilitador maibe mos staff tekniku implementa programa mikro hanesan jestaun floresta no atividade hasae rendementu. OJT sei fo iha implementasaun programa mikro, konvida staff hosi ONG no individual nebe iha interese iha assuntu espesifiku (esemplu; agrikultura, floresta, vida moris) no hakarak atu servisu iha fatin ruma iha bacias hidrografikas iha future.

3) Desenvolve kapacidade hosi Officis MAP hodi hadia mekanismu CB-NRM


DNFGBH iha funsaun atu hasae mekanismu CB-NRM liu hosi area bacias hidrgrafikas kritiku liu hosi kolaborasaun ho ONG no programa desenvolvimentu/projeto hosi DP. Atu atinji obrigasaun nee, nee importante atu institucionalija assuntu CB-NRM iha servisu governu ho estabesele seksaun independente CB-NRM iha DNFGBH ou DN seluk hosi MAP, atu nune officias sir abele foo motivasaun nebe diak no direta atu promove CB-NRM. Projeto sei facilita hanesan preparasaun institucional hosi perspetivu tempo naruk, hanesan nebe tau iha politika basiku 5. Ba tempo badak, sei fornese oportunitade barak ba parceiru sira atu funciona hanesan advokador nebe esplika efetividade hosi CB-NRM kona ba jestaun rekursu no desenvolve komunidade ba parceiru sira seluk, inklui komunidade. Advokasia inklui apresentasaun hosi susessu hosi projeto iha fase 1. Sira

karik simu buat balun no husu advise tekniku. Liu hosi interasan ho parceiru sira, sira bele komprende diak liu kona ba CB-NRM no hametin diak liu sensibilidade hanesan nain.

**Politika Basiku 4: Fatin nebe Efetivu hosi mekanismu CB-NRM hodi halo espansaun**

Atu promove utilijasaun mekanismu CB-NRM, tengki desenha baseia ba rekursu humanu no fisiku nebe disponivel iha Timor-Leste.. maibe, aplikasaun simples hosi regulamentu suku hanesan no planu uja rai ba iha komunidadade diferente bele tun/menus ninia efetividade hosi mekanismu. Tamba nee, importante atu lokalija ou ajusta mekanismu baseia ba rekursu nebe iha komunidadade hodi mantein ninia efetividade. Atu atinji objetivu nee, ONG nebe hili sei lidera iha atividade resultadu 3 hodi introdus mekanismu CB-NRM ba iha suku target maske sira tengki tuir processu basiku nebe tau iha manual. Projeto sei focus ba iha mantein efetividade hosi mekanismu CB-NRM ho monitoring besik sira nia atividade.

Hanesan mensiona iha leten, ba resultadu 3, Projeto planu atu inovolve membro staff hosi ONG seluk nebe involve iha agrikultura/seitor floresta ou hirak nebe kolabora ho parceiro desenvolvimentu seluk, no treinu sira ba facilitador CB-NRM iha future liu hosi esperiencia iha terrenu. Iha processo hosi desenvolve kapacidade, mekanimsu CB-NRM mos sei tau iha fatin. Projeto sei hare fali processo no susesu hirak nee atu nune bele asegra standarijasaun nebe propriu ba mekanismu CB-NRM (Figura 4).

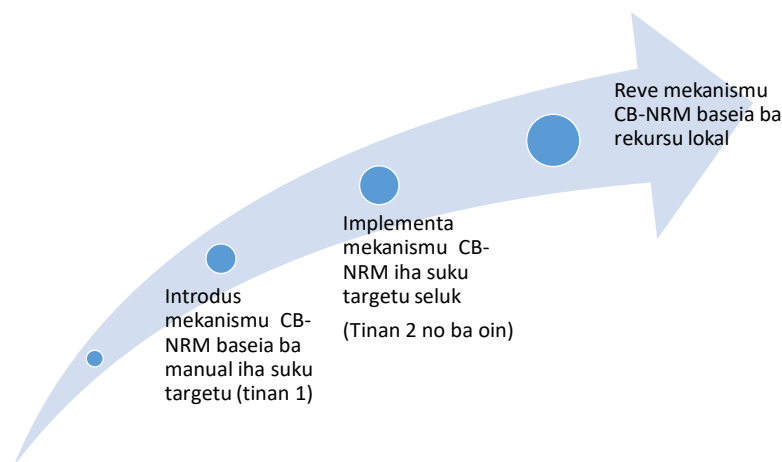

**Figura 4: Processo lokalijasasun hosi implementasaun mekanismu CB-NRM**

Maske Projeto sei permite mekanismu nebe lokalija ou ajusta iha kontestu local, Projeto sei assegura katk pontu hirak tuir mai sei hakonu atu mantein kualidade hosi mekanismu CB-NRM.

- a. Reflesaun opinaun hosi membro komunidadade kona ba planu usa rai no regulamentu suku.
- b. Participasaun nebe ativu hosi lider suku no lider local seluk iha forma regulamentu suku.
- c. Consultasaun ho membro komunidadade seluk kona ba implementasaun regulamentu suku.
- d. Enkontro periodika ba monitoring regulamentu no partiipasaun membro komunidadade.
- e. Participasaun ativu hosi membro komunidadae iha atividade programa mikro.

- f. Komprensaun membro comunidade kona ba relasaun entre planu uja rai, regulamentu suku no programa mikro.

**Politika Basiku 5: Hametin politika ambiente ba espansaun mekanismu CB-NRM.**

Atu halo espansaun kontinuasun hosi mekanismu CB-NRM depois remata projeto, nee importante atu simu politika no supporta institucional. Projeto sei buka possibilidade hosi politika no supporta institucional.

1) Politika justifikasaun ba espansaun mekanismu CB-NRM

Ho supporta hosi FAO, GOTL planu atu reve Politika Seitor Floresta nebe orijinalmente halo iha 2008. Desde maneira espansaun mechanism CB-NRM bele diskuti no hare fali iha processo revijaun hanesan nee sai prinsipiu politika hosi seitor, Projeto sei koopera ho diak ho processo revijaun. Em particular, projeto sei fahe informasaun necessariu no prepara fatin vijita ba verifikasun, atu hare ba mekanismu CB-NRM iha seitor politika. Karik revijaun politika halo liu hosi nebe mak espera, projeto sei servisu ho DNFGGBH atu esplora alternative balun hodi institucionalija mekanismu CB-NRM iha nivel politika

2) Estabelese seksaun CB-NRM

CB-NRM ninia perukupasaun ho politika seitor floresta, rekonhementu hosi CB-NRM entre officias DNFGGBH no DNCN nebe agora dadauk la ass tamba laiha departamentu espesifiku ba promove CB-NRM. Iha kondisaun hanesan nee, assegura osamentu ba CB-NRM nee sai dificil, no DNFGGBH la bele halo assaun atu promove CB-NRM. Rekomendasaun politika nebe halo ona iha faje ida uluk nebe identifika estabelementu seksaun independente ida ba CB-NRM hanesan politika importante ida hamutuk ho desenvolve kapaidade no provijaun pakote tekniku.. desde estabelementu seksaun foun nee iha relasaun direta ba revijaun estabelese organijasaun iha MAP, Projeto sei promove estabelementu seksaun CB-NRM liu hosi promove komprensaun hosi CB-NRM ba jestaun MAP no officias DNFGGBH no Diresaun Nasional Conservasaun Natureja (DNCN).

Iha parte seluk, karik neefacil ba diresaun nasional ida atu estabelese departamentu foun tamba precisa revijaun lei organika. Iha situasaun nee, projeto sei promove estabelementu seksaun CB-NRM, ida, iha Bacias Hidrografikas no Departamentu Jestaun Koastal Area ou Reforestasaun no Rai no Departamentu Konservasaun bee hosi DNFGGBH. Ho inkorpora atividade CB-NRM ba iha atividade regular hosi DNFGGBH iha rekor nebe diak iha terrenu, Projeto sei ajuda seksaun CB-NRM atu hadia ba iha departamentu foun banhira restrutura organijasaun.

3) Preparasaun dokumentu politika ba implementasaun planu assaun

Atu iha planu assaun nebe efetivu, dokumentu tengki approva laos deit hosi DNFGGBH maibe mos hosi

MAP. Iha ikus, Projeto planu atu prepara dokumentu politika (Ezemplu rekomendasaun politika) ba iha implementasaun planu assaun hamutuk ho DNFGBH no Dncn no hetan approvasaun hosi Diretor Jeral floresta, kafe no plantasa industrial, depois sei hetan approvasaun hosi Ministru.

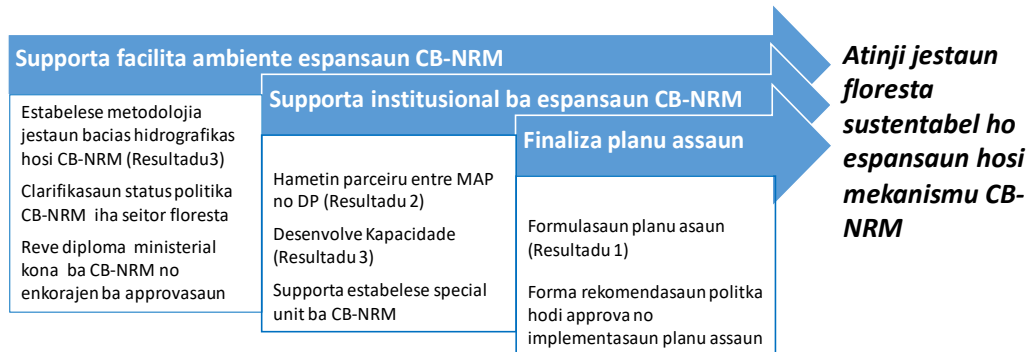


Figura 5 Supporta necessariu ba espansaun CB-NRM

### 3. Metodo Applika ba Atividade Projetu

#### 3.1 Lina jerl no Lalaok Servisu hosi Atividade

Atividade bele kategoria ba iha grupo 4, ho naran (i) Jestaun em jeral, (ii) Resultadu 1, (iii) Resultadu 2 no (iv) Resultadu 3.

#### 3.2 Atividade ba Jestaun em Jeral

##### (1) Preparasaun Planu Servisu

Atu lansa projeto sei premeiru prepara esbosu Planu servisu nebe iha sumariu politika basiku, metodolojia hosi halao atividade no esbosu horariu hosi implementasaun hosi period projeto hotu. Baseia ba iha esbosu, diskussaun sei halao ho instituisaun governu relevante atu nune fahe vijaun jeral hosi projeto. Esbosu Planu Servisu sei finalija baseia ba diskussaun no akordu nebe sei halo entre TL ho parte Japunese.

##### (2) Atividade Preparasaun

- 1) Organiza enkontro premeiru ho instituisaun governu iha relasaun servisu
- 2) Reve esbosu PDM no PO karik precisa

Projeto sei halao enkontro premeiru ho MAP atu diskuti esbosu planu servisu. Iha enkontro nee, versaun PDM no PO agora mos sei diskuti hodi halo revijaun karik identifika nesecidade ruma. Diskussaun kona ba esbosu Planu servisu sei focus ba iha komprensaun hosi Politika Basiku, inklui:

- i. Espetativa MAP no idea kona ba kontiudo nebe sei inklui iha planu laran
- ii. Espetativa MAP no Idea kona ba oinsa atu halao ho estabelese plataforma CB-NRM

- iii. Principal no metodo ba desenvolve kapaidade atu halao hosi projeto nee
- iv. Localizasaun mekanismu CB-NRM
- v. Institusionalijasaun mekanismu CB-NRM no habelar iha rai laran

(3) Organiza workshop CB-NRM ba parceiru sira

Nee ho objetivu atu fahe konhecementu no pratika diak ho parceiru sira seluk, Projeto sei organija workshop CB-NRM ba parceiru sira tinan ida dala ida. Lina jeral esbosu hosi workshop hatudu iha tabela tuir mai. Detaihu hosi workshop, inklui instituisaun nebe sei konvida, sei decide liu hosi diskussaun ho MAP.

**Tabela 1: Esbosu lina jeral ba workshop CB-NRM ba Parceiru sira**

Participante	Instituisaun governu (incl. MAP), ONG local, DP, estensionista, guarda floresta, representante comunidade (Pelmenus ema 50l)
Data	Novembru 2016, 1017 no 2018, no Mar. 2020
Fatin	Dili
Objetivu	Troka konhecementu no aprendijajen hosi implementasaun mekanismu CB-NRM
Programa	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Apresentasaun kona ba issu seitor (esemplu, politika floresta no lei basiku floresta)</li> <li>● Principais hosi mekanismu CB-NRM (fundamentu, approximasaun, resultadu hosi projet fase I, etc.)</li> <li>● Issu importante hosi CB-NRM (formulasaun mapa no estabelesementu plataforma etc.)</li> <li>● Progressu hosi implementasaun mekanismu CB-NRM (incl. apresentasaun pratika diak, troka lisaun no konhecementu, no diskussaun kona ba uja manual no instrument seluk hodi hadia diak liu)</li> </ul>

(4) Treinamentu iha Japaun

Projeto sei organija treinamentu iha Japaun kona ba topiku hosi participatoriu bacias hidrografikas/jestaun floresta (total dala 3). Esbosu lina jeral hosi programa treinamentu hanesan tuir mai nee.

**Tabela 2 Esbosu lina jeral hosi treinamentu iha Japaun**

Participante	Officias DNFGBH no membro ONG karik bele (ema 3/treinamentu)
Temu (Durasan)	Abril 2017, 2018 no 2019 (pelmenus semana rua kada treinamentu)
Objetivu	Atu aprende kona ba jestaun rekursu natural participatoriu no jestaun bacis hidrografikas iha Japaun
Programa	<p>Semana 1: leitura jeral kona ba bacias hidrografikas/jestaun floresta iha Japaun ho vijita relevante ba ajencia iha Tokyo</p> <p>Semana 2: visita terenu (tuir planu hanesan tuir mai)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mie province (atu komprende basiku hosi planu jestaun floresta no koncelho protesau ambiente bacias hidrografiks)</li> <li>2. Toyama province (atu komprende funsaun hosi agricultural no centru promosaun floresta hodi hadia toos, rekursu bee, no protesau ambiente)</li> <li>3. Kouchi province (atu aprende kona ba lei no regulamentu ba protesau mota Simanto)</li> </ol>

(5) Joint coordination Committee (JCC) no Joint Monitoring Meeting

Projeto sei organija JCC no enkontro monitoring hamutuk atu asegura implementasaun nebe diak hosi atividade no konfirma issu no resultadu nebe hetan.

**Tabela 3 Esbosu lina jeral ba JCC no Joint Monitoring**

enkontro	Frekuencia	Agenda
JCC	Kada tinan (Setembru)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasau no approva hosi planu anual</li> <li>• Konsider obstaklu nebe iha no lanu ba korespondencia</li> <li>• Jestaun hosi progresso projeto</li> </ul>
Joint monitoring	Kada fulan neen (Setembru no Feb)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Confirmaun indikador PDM no PO</li> <li>• Avaliasaun progresso ba iha objetivu projeto no resultadu</li> </ul>

(6) Relatoriu Annual Kompletu

Fulan rua antes projeto kompletu, esbosu hosi relatoriu kompletu tenki prepara iha kooperasaun ho parceiru sira no hatama ba iha JICA Timor Leste. Relatoriu finalija ho inkorpora resultadu hosi JICA no JCC. Relatoriu final sei hatama ba iha headquarter JICA.

**3.3 Atividade ba Resultadu 1**

**[1-1] Identifika issu nebe sei diriji no medida nebe sei foti ba espansaun mekanismu CB-NRM iha bacias hidrografikas iha Timor-Leste.**

[1-1-1] Atu hetan informasaun relevante kona ba politika, programa, estratejia, matadalan relasiona ba CB-NRM hosi instituisaun varidade no projeto iha passadu

[1-1-2] Atu analija informasaun nebe tau hamutuk atu identifika issu nebe diriji no medida nebe foti

Projeto sei kolekta informasaun no konhecementu nebe akumula iha fase 1. No mos, informasaun kona ba progresso hosi projeto nebe halao hosi ONG no DP bele mos tau hamutuk. Depois kolekta informasaun, Projeto hare fali issu ba espansaun mekanismu CB-NRM no possibilidade ba kooperasaun ho parceiru sira.

**Tabela 4 Rekursu informasaun nebe karik iha**

DP/ Projeto	Atividade importante	Relasaun ba Projeto Agora (Pontu de vista ba analija)
FAO	Supporta formulasaun lei floresta no revijaun politika seitor floresta	Presija atu konfirma katak CB-NRM rekonhece hanesan instrument importante ida iha relasaun ba iha formulasaun hosi lei floresta no revijaun hosi politika seitor floresta.
USAID	Supporta desenvolve agrikultura liu hosi ANVASA, nebe promove valor desenvolve ba hortikultura no hadia jestaun rekursu natural.	USAID hatudu ona interese iha resultadu hosi Projeto fase 1, inklui PLUP no PM. Precisa atu hare area nebe iha possibilidade ba operasaun inklui aspetu projeto.
DFAT	Supporta agrikultura no desenvolvimentu rural liu hosi halo toos prosperiedade (TOMAK)/	DFAT hatudu ona interese iha PLUP nebe halao hosi Projeto Fase 1. Precisa atu diskuti kona ba possibilidade implementa PLUP iha TOMAK
EU/GIZ	Liu hosi Global Climate Change Alliance (GCCA), EU/GIZ formula planu assaun iha nivel suku atu fornese informasaun nebe iha relasaun ho iklim ba toos nain sira, atu nune sira bele adopta modansa klimatika	EU/GIZ mos hatudu interese iha PLUP. Precisa atu diskuti kona ba possibilidade implementa PLUP iha TOMAK Nomos EU/GIZ organiza projeto hanesan ba PM hosi Projeto nee, nebe lissaun bele halao hodi hadia iha fatin projeto.
seluk	EU organiza pograma desenvolve floresta, no Banku Mundial supporta agrikultura no projeto jestaun bacias hidrografikas	Precisa atu komprende detailhu hosi sira nia projeto karik esiste hanesan entre sira nia projeto no projeto nee, konsidera ninia meius.
JICA	JICA iha projeto nebe ajuda ba formulasaun Planu Konservasaun Floresta.	Bele utilija Planu Konsevasaun Floresta ba desenvolve lalaok CB-NRM

## **[1-2] Desenvolve quadro servisu atu haluan mekansmu CB-NR**

[1-2-1] Atu konsulta ho parceiru sira nebe servisu kona ba reve politika seitor floresta atu aseguira lalaok hosi sira nia atividade

Baseia ba atividade 1-1, Projeto sei identifika pontu importante no direasaun ba reve politika seitor floresta. Iha projeto faje 1, grupo trabalho analija situasaun iha seitor floresta, identifika problema, no medida ba solusaun. Projeto, uja esperiencia, sei diskuti ho parceiro sira no koko atu hari komprensaun komun konaba uja issu no approximasau.

Ho koordenasau ho DP, tamba iha konsiderasaun sei foo ba FAO, ho assiste hosi MAP iha revijaun ba politika seitor floresta. Hala parte iha servisu revijaun, Projeto sei koko atu institucionalija CB-NRM iha politika.

[1-2-2] Atu determina tempu naruk ba espansaun CB-NRM ba iha bacias hidrografikas importante

Objetivu hosi politika floresta agora nee efetivu ba protesaun integridade ekolojikal no komposisaun biolojikal laliu hosi 70% hosi area floresta iha tinan 2020. Tamba nee, planu konservasaun floresta ninia objetivu katak pelmenus 73% hosi ai laran tuan iha area floresta importante sei proteje no pelmenus 50% hosi suku nebe lokalija iha area floresta importante sei tama ba iha comunidade baseia ba jestaun floresta iha tinan 2023. Ho target nee Projeto sei determna quadro servisu ba lalaok planu assaun, no foo atensaun ba progresso hosi revijaun hosi politika seitor floresta, nebe kontinua iha tinan 2016.

[1-2-3] Atu halo esbosu lina jeral kaudru servisu hosi planu assaun

Planu assaun sei formula iha Projeto nee sei funsiona hanesan masterplan ba espansaun CB-NRM. Hosi pontu de vista, planu assaun tenki representa oinsa mekanismu CB-NRM sei haluan jeografikamente no oinsa autor sira (esemplug. MAP, ONG no DPs) bele kontribui ba espansaun mekanismu CB-NRM. Projeto sei iha esbosu lina jeral quadro servisu hosi planu assaun, nebe ajuda autor sira atu komprende signifikadu hosi formulasaun planu funsaun no mos atu diskuti lalaok esforsu hamutuk iha futuru.

## **[1-3] Esbosu planu assaun atu habelar mekanismu CB-NRM**

[1-3-1] Atu organija taskforce atu prepara planu assaun

Projeto sei estabese taskforce, tau offias DNFGBH iha centru hanesan membro sira. Sir abele funsiona hanesan membro importante, nebe iha papel importante atu advokasia valor hosi kria planu assaun no facilita komprensaun kona ba planu assaun laos det hosi MAP maibe mos autor seluk no parceiro sira. Atu estabese taskforce, projet sei organija enkontro ho parceiro importante (esemlu servisu grupo ba revijaun politika seitor floresta, ONG, no DP) atu maintain sira nia input. Taskforce ba formulasaun planu assaun bele mos servisu ba esstabelementu hosi plataforma CB-NRM, nebe hareba iha atividade iha Resultadu 2.

[1-3-2] Atu halao enkontro balun atu assesu ba situasaun (esemplu implementasaun rekomendasaun politika ba espansaun CB-NRM, desenvolve kapaidade hosi autor importante no informasaun nebe mai hosi plataforma CB-NRM) atu diskuti planu assaun

Projeto sei hare fali pontu hirak tuir mai ba formulasaun hosi planu assaun. Assesmentu sei halo liu hosi enkontro balun ho autor importante (incl. enkontro taskforce, enkontro plataforma, no workshop parceiro CB-NRM).

- Progreso kona ba implementasaun hosi rekomendasaun politika nebe formula ona hosi Projeto faje 1ba espansaun CB-NRM
- Planu ba assesmentu kapacidade no desenvolvimentu hosi autor importante ba implementasaun hosi mekanismu CB-NRM (liuliu ba PLUP)
- Progreso iha estabeselementu plataforma CB-NRM no meius hosi utilijasaun

[1-3-3] Atu iha esbosu hosi planu assaun iha konsultasaun ho DNFGBH no officias MAP

[1-3-4] Atu finalija planu assaun iha dokumentu nebe tau hamutuk

Projeto sei prepara planu annual hosi espansaun CB-NRM ba bacias hidrografikas kritiku ho hare ba atividade hosi autor importante no parcero seluk nebe iha relasaun ba CB-NRM. No mos sei identifika gap entre saida mak tenki halo no saida ma bele halo ho rekursu nebe iha no indika assaun necessariu ba mitigasaun hosi gap. Planu assaun agora sei kompstu hosi elementu rua tuir mai.

(1) Hare fali planu assaun hosi autor importante kada bacias hidrografikas no suku

Projeto sei tau hamutuk planu assaun hosi mekanismu CB-NRM no atividade nebe iha relasaun, nebe mak planu ou implementa hosi autor importante, hatudu iha kuadru servisu.

Area implementasaun				CB-NRM ou atividade nebe iha relasaun		Tempu				
Bacias hidrografikas	Municipiu	Postu administrativu	Suco	Atividde importante	autor	20XX	...	...	...	...
AAA	BBB	CCC	DDD	PLUP/ SUFP ho CBSE-MP	NGO (XXX)/ DP(YYY)	[Barra]				
⋮	⋮	⋮	EEE	PLUP/Valor desenvolvimentu	CCC	[Barra]				
			FFF	PLUP/ SUB/PF-MP	XYZ /ABC	[Barra]				

**Figura 2 Imajen hosi planu assaun kada bacias hidrografikas kritiku/suku**

(2) Implementasaun kuadru servisu ba espansaun hosi CB-NRM

Baseia ba mapa iha leten, projeto sei hare fali institucional nebe pronto ho ninia autor importante, hanesan nebe identifika karik iha gap atu prence no hatu assaun atu hare ba iha espansaun CB-NRM.

Autor	medida nebe foti	maneira implementasaun	Tempo							
			I	II	III	IV	I	II	III	IV
MAF	Estabeselementu departementu CB-NRM	Officializa taskfrse CB-NRM ba planu assaun	[Barra]							
JICA CB-NRM Projeto 2	Expansaun CB-NRM	Offerece OJT ba ONG lokal		[Barra]				[Barra]		
NGO (XXX)	Komprende PLUP	Participa iha OJT hosi CB-NRM		[Barra]						

**Figura 3 Imajen hosi kuadru servisu implementasaun ba autor importante atu haluan mekanismu CB-NRM**



**[1-4] Mantein akordu no approvasaun official hosi MAP ba iha planu assaun**

[1-4-1] Atu esprika esbosu inisial hosi planu asaun ba autoridade relevante no parceiro iha MAP

Projeto sei apresenta esbosu planu assaun nebe formula iha atividade [1-3] ba MAP no parceiro sira seluk, esemplu liu hosi enkonro plataforma CB-NRM.

[1-4-2] Atu organija diskussaun ba elaborasaun planu assaun

Tuir atividade [1-4-1], projeto sei halao diskussaun ho parceiro sira tuir iniativu hosi taskforce, atu nune hare fali planu assaun. No mos, atu asegura implementasaun hosi planu asaun, Projeto sei assiste taskforce iha desenvolve rekomendasaun politika. Tamba konsultsaun nebe halo ho autoridade MAP, atu bele mantein sira nia vijaun no komprensaun ba finalijasaun.

[1-4-3] Atu hatama esbosu final ba autoridade iha MAP ba approva

Esbosu final hosi planu assaun sei hatama ba DG hosi Floresta liu hosi DNFGGBH ba approva. No mos projeto sei konsulta ho DG atu hatama rekomendasaun politika ba ministru hodi approva, nebe asegura implementasaun hosi planu assaun institusionalmente.

### 3.4 Atividade ba Rezutadu 2

[2-1] Fasilita estabeselementu sekretariadu ida iha MAP/DNFGGBH iha konkordansia ho redi servisu ne'ebe existi ona.

[2-1-1] Avalia redi servisu ne'ebe existiti ona no sedauk iha hodi estabeselese plataforma CB-NRM

Projetu ne'e sei akumula informassaun hosi redi servisu no forum ne'ebe existi ona, ne'ebe funsiona iha seitor floresta no agricultura (e.z. vizaun, misaun, atividade sira ne'ebe lao hela no performansia sira) tarjetu atual ba estudu maka "HASATIL" ne'ebe integra ona ONG balun ne'ebe servisu iha seitor floresta no agricultura. Maibe, area servisu ne'e sei habelar karik mak iha entidade seluk identifika durante implemenntasaun projektu.

Intrevista ho redi servisu/forum sei identiika lisaun sira ba parseiru koordensaun no mos possibilidade kolaborasaun ho plataforma CB-NRM, ne'ebe sei estabeselese iha projektu ne'e nia okos.

**Tabela 5 Ezemplu hosi informasaun ne'ebe kolekta hosi redi servisu/forum ne'ebe existi ona**

✓ Numeru partisipante/organizasaun	✓ Vizaun no Misaun
✓ Organizador redi servisu/forum	✓ Sumariu atividade no rezultadu
✓ Rekursu Fundu	✓ Lisaun no possibilidade ba kooperasaun

[2-1-2] Estabeselese ekipa servisu hodi dezenvolve plataforma ida iha koordensaun ho DNFGGBH no parseiru relevante sira seluk

Projetu ne'e sei estabeselese ekipa servisu ida liuhusi konsultasaun ho autor prinsipal sira, inklui DNFGGBH. Atu bele integra atividade oi-oin hosi projektu ida ne'e no uza ho didiak numeru limitaadu funsionaria DNFGGBH nian, sugere atu ekipa servisu ba formulasaun [1-3-1]) no mos ba estabeselementu CB-NRM ho assistensia hosi ONG no peritu JICA involve iha Atividade CB-NRM ne'e.

[2-1-3] Diskuti konseitu, objetivu, funsaun no atividade hosi plataforma CB-NRM nian

Ho assistensia hosi peritu JICA nian, ekipa servisu sei produs konseitu kona-ba plataforma, inklui objetivu, funsaun, no atividade sira. Hanesan tau ona iha politika baziku, tanba konsiderasaun sei fo ba issue oinsa atu fomesse insentivu/benefisiu atual ba parseiru hodi partisipa iha plataforma ne'e. espera katak plataforma ne'e bele fomesse oportunidade hodi halo-liga entre parseiru no sira seluk no informasaun kona-ba rekursu humano ne'ebe bele halao mekanismu CB-NRM no atividade sira ne'ebe relaciona ho mekanismu ne'e.

[2-1-4] Finaliza konseitu no plannu sira ho identifikasaun membru sira

Bazeia ba atividade [2-1-3], projetu ne'e sei ajuda ekipa servisu ba finalizasaun konseitu no depois halo formulasau planu asaun ba estabesementu. No mos ekipa servisu sei examina plataforma membru nian, responsabilidade no papel hosi membru ida-idak, no regulamentu hodi halo jestaun. Tuir ida ne'e, sira sei determina membru hosi sekretariadu ba plataforma ne'e. durante tempu hein atu ekipa servisu bele sai sekretaridu, detallu sei konfirmadu liuhusi diskusaun ho DNFGBH.

[2-2] Identifika parseiru no autor operacional prinsipal servisu iha terrenu relevante ho CB-NRM

[2-2-1] Akumula informasaun kona-ba parseiru sira ne'ebe servisu iha rea relevante ho CB-NRM

Ekipa servisu/sekretariadu sei kolekta informasaun kona-ba parseiru oi-oin ne'ebe servisu iha terrenu plataforma CB-NRM nian. Sira ne'e bele kategoriza ba grupu sira tuir mai ( hare tabela iha kraik ne'e).

**Tabela 6 Parseiru ne'ebe servisu iha terrenu relevante ho CB-NRM**

Ofisial governo lokal/sentral	DPs no sira nia projetu
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ NDFWM/NDNC</li> <li>✓ Departamentu seluk iha MAP</li> <li>✓ Edefisiu MAP Municipio</li> <li>✓ Edefisiu Administrativu Municipio/Posto Administrativu</li> <li>✓ Estensionista</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ USAID: ANVASA Projetu de desenvolvimento agrikultura</li> <li>✓ DFAT: Seeds for Life and Farming for Prosperity (TOMAK) project</li> <li>✓ Banku Mundial: Programa jestaun agrikultura bacias hidrograficas</li> <li>✓ EU: Programa de desenvolvimento rural (RDPIV)</li> <li>✓ EU/GIZ: Aliansa mudansa climatika global (GCCA)</li> </ul>
Komunidade	Institusaun sira iha nivel comunidade
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Xefi de suku</li> <li>✓ Lider seluk iha suku</li> <li>✓ Komundade rasik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Konsellu jestaun bacias hidrograficas</li> <li>✓ ONG lokal sira</li> </ul>

Projetu ne'e sei ajuda ekipa servisu/sekretariadu hodi halao intrevista ho sira no review fali materials ne'ebe sira produs ona ba atividade sira. Dadus ne'ebe koilleta hanesan hatudu iha tabela iha kraik ne'e, dadus ne'ebe koilleta sei organiza iha matrix. Atu fomesse insentivu/benefisiu ba partisipante sira hosi plataforma, entrevista sei halao hodi aprende kona-ba sira nia nesessidade ba informasaun no apoiu tekniku.

**Tabela 7 Ezemplu hosi dadus ne'ebe kolekta hosi parseiru sira iha terrenu CB-NRM nian**

<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sumariu hosi projetu kona-ba jestaun bacias hidrograficas (area tarjetu, medida projetu, durasaun no detallu atividade)</li> <li>✓ Sira nia abilidade desemina teknologia no informasaun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Interese iha plataforma/intensaun ba kooperasaun</li> <li>✓ Informasaun no nesessidade ba apoiu</li> </ul>
--	---

[2-2-2] Kontaktu ho parseiru potensial hodi sensibiliza idea kona—ba plataforma CB-NRM

Bazeia ba matrix de desenvolvimento iha Atividade [2-2-1], ekipa servisu/sekretariadu sei identifika possibilidade

participante entre parseiru sira, ne'ebe iha intensaan hakarak involve-an iha plataforma CB-NRM. Depois de identifikasaun, sira sei oficialmente hetan konvite ba plataforma ne'e.

[2-3] Ajuda plataforma CB-NRM hodi sensibiliza ba membru sira kona-ba plataforma mekanismu CB-NRM no regularmente troka informasaun no akumulula lisaun aprende no pratika diak sira.

[2-3-1] Apoiu sekretariadu hodi organiza enkontru regular ba sensibilizasaun no troka informasaun

Projetu ne'e sei ajuda sekretariadu hodi halao enkontru plataforma CB-NRM nian, pelumenus inisiamente halao kada tinan-rua. Enkontru ne'e sei halao hamutuk ho workshop parseiru CB-NRM nian, tanba participante sira iha plataforma ne'e sei hola parte iha workshop sira ne'e ho topiku ne'ebe iha similiaridade. Tanba tuir tempu ba tempu mekanismu CB-NRM ne'e habelar-an tuir rezultadu/outcomes ne'ebe hetan en termus dezvoltamentu kapasidade no vida moris komunidadade, nesidade atu nafatin iha plataformma sei reinforsa liutan. Iha kazu sira hanesan ne'e frekuensia enkontru tenke mos aumenta/hasae.

Projetu ne'e mos sei apoiu sekretariadu iha involvimentu ba atividade fahe informasaun no promosaun iha adisaun ba enkontru regular hosi plataforma CB-NRM nian. Sira ne'e inklui apresentasaun iha nasaun laran ka iha nasaun seluk, prezensa iha enkontru organiza hosi parseiru dezvoltamentu seluk, no apoiu tekniku ba projetu seluk tuir pedidu ne'ebe iha.

[2-3-2] Apoiu sekretariadu hodi mantein relatoriu hosi enkontru regular/atividade troka informasaun

Projetu ne'e sei ajuda sekretariadu iha preparasaun minutos enkontru ba plataforma no halo relatoriu karik sira hola parte iha enkontru no atividade seluk aparte hosi enkontru plataforma.

[2-3-3] Apoiu sekretariadu hodi akumulula lisaun aprende no pratika diak sira relata iha enkontru sira/atividade troka informasaun

Projetu ne'e sei ajuda sekretariadu akumulula lisau aprende no pratika diak sira iha relatoriu annual no brosur no ho parseiru fahe informasaun sira ne'e.

[2-4] Formula pakote foun rekomendasaun politika kona-ba futuru espansaun hosi mekanismu CB-NRM

[2-4-1] Fasiita DNFGBH hodi reviu no evalua rezultadu Rekomendasaun Politika ba espansaun CB-NRM hodi identifika problema no asaun nesessariu sira ba espansaun CB-NRM liutan

Iha tinan (2020), projetu ne'e sei examina obstakulu no asaun nesessariu ba espansaun mekanismu CB-NRM. Examinasaun inklui fasilitasaun DNFGBH ho reviu no evalua rezultadu hosi rekomendasaun politika ne'ebe dezvoltolve iha faze 1. Sei reviu progresu hosi espansaun mekanismu CB-NRM, laos deit iha suku sira suporta hosi projetu ne'e maibe mos iha suku seluk ne'ebe tarjetu hosi ONG no parseiru dezvoltamentu. Dadus sei kolekta hosi relatoriu no intrevista. Ezemplu hosi informasaun ne'ebe sei kolekta mak hanesan hatudu iha tabela kraik ne'e.

**Tabela 8 Ezbosu konseitu hosi revizaun Rekomendasaun politika**

Konteudu hosi revizaun		Rekursu informasaun	
✓	Determinasaun nivel atinjimentu bazcia ba benchmark monitorizausaun estabese iha rekomendasaun politika prepara iha faze 1 (refere ba tabela tuir mai)	✓	Relatoriu Projeto
✓	Identifikasaun status hosi espansaun CB-NRM (identifikasaun bottleneck iha instutisionaliza/implementasaun arranjametu no mitigasaun ba sira)	✓	Intrevista ho autor implementador sira (inklui MAP no parseiru dezentvolvimentu)
✓	Determinasaun hosi validade hosi konteudu rekomendasaun	✓	Informasaun ne'ebe sirkula iha ministeriu laran
		✓	Regulamentu ne'ebe relasionadu

[2-4-2] Ajuda DNFBGH iha diskusaun no halo ezbosu ba pakote foun rekomendasaun politika ba period depois 2019

Projeto ne'e, depois konsolida rezultadu hosi revizaun, sei ajuda DNFBGH iha dezentvolvimentu rekomendasaun politika ba depois 2019. Rekomendasaun ne'e bele inklui instutisinalizasaun hosi hanesan esklarese ona iha politika baziku hosi projeto ne'e.

[2-4-3] Konsulta ho membru sira hosi plataforma CB-NRM nian kona-ba ezbosu rekomendasau politika.

Ezbosu hosi rekomendasaun politika prepara ona iha atividade [2-4-2] sei diskuti iha enkontru hosi plataforma CB-NRM. Validade hosi rekomendasaun sei konfirma ho progresu hosi estensaun CB-NRM no mos obstakulu no sasukat mitigasaun hasoru durante espansaun. Esforsu sei halo hodi hetan konsensus hosi MAP no parseiru seluk sira ba efetividade hosi rekomendasaun sira ne'e.

[2-4-4] Atu finaliza no submete pakote foun hosi rekomendasaun politika hodi hetan aprovasaun hosi Ministro

Projeto ne'e sei finaliza rekomendasaun politika ho DNFBGH liuhosi inkorpora komentariu no sugestaun sira hetan iha atividade [2-4-3]. Rekomendasaun ne'e sei submete ba autoridade nivel alto MAP nian. Projeto ne'e sei ajuda DNFBGH no DG hodi hetan aprovasaun hosi Ministro.

### 3.5 Atividade ba Resultado 3

[3-1] Facilita implementasaun mekanismu CB-NRM iha fatin projeto, tuir manual nebe desenvolve iha fase 1

[3-1-1] Atu monitor implementasaun CB-NRM iha suku neen, nebe intervensaun halo hosi fase 1

Desde nee liu hosi suku neen depois remata iha fase 1, Projeto sei hare fali ba suku target ba iha sira nia kontinuasaun hosi atividade CB-NRM. Intervista sei halao ho lider suku ho objetivu identifika hanesan tuir mai:

- Status hosi implementasaun monitoring hosi komite suku
- Numeru aktu illegal nebe akontese iha suku (esemplu sunu ai laran, deforestasaun illegal, estraga ai han hosi animal); no
- Obstaklu ba kontinua CB-NRM iha futuru.

Resultadu hosi atulijasaun sei fahe ho DNFBGH no ONG sub contract no sei iha konsiderasaun halao mekanismu CB-NRM iha fase nee. Desde suku neen sai target hosi fase 1 mak membro sira hosi koncelho jestaun bacias hidrogafikas iha Noru. Projeto sei kontinua monitoring sira nia atividade no hare ba iha supporta indireta ba sira nia esemplu halo hanesan ho DP.

[3-1-2] Atu halao PLUP iha suku iha fatin Projeto

Atividade nee sei halao liu hosi sub kontratu ba ONG, nebe iha esperiencia substansial implementa mekanismu

CB-NRM no atividade seluk nebe iha relasaun. Nomos hanesan nebe tau iha Politika Basiku 3, projeto sei involve ONG seluk nebe iha interese iha mekanismu CB-NRM (PLUP no MP) ho desenha TOR atu inklui OJT ba seluk, tamba nee atu desenvolve rekursu humanu ba espansaun iha future hosi CB-NRM.

Atividade sei halao iha etapa tolu: 1) hili suku targetu, 2) estudu ba uja rai agora, no 3) Implementasaun PLUP. Hanesan esplika iha Politika Basiku 4 ba lokalijasaun mekanismu CB-NRM, funsaun hosi C/P no peritus JICA sei limite ba monitoring hosi progresso banhira implementasaun atual PLUP sei halao hosi ONG nebe sei sai sub Kontrak.

### 1) Hili Suku Targetu

Ho objetivu atu kapacita autor importante ba implementasaun hosi mekanismu CB-NRM, projeto sei halao iha nivel comunidade. Rekursu projeto sei aloka ba implementasaun iha suku neen iha sub bacias hidrografikas Noru no Bemós (esemplu suku 6 hosi sub bacias hidrografikas 2). Detailhu kona ba hili sei diskuti ho MAP/DNFBGH iha kursu preparasaun. Passu approximasaun sei foti ba fase 2 (esemplu suku 3 kada fase). Grupo premeiru sei keda iha incepsaun hosi projeto no segundu sei hahu tuir mai

### 2) Studu kona ba uja rai agora

Hanesan parte hosi preparasaun PLUP, estudu kona ba uja rai agora sei halao iha suku targetu. Nee sei identifika area floresta, frekuenia hosi akontesementu sunu ai laran, nivel degradasaun ambiente natureja, status no titlu rai, disponibilidade rekursu natural no presensa grupo comunidade no regulamentus.

### 3) PLUP

PLUP sei implementa hanesan nebe hatudu iha tabela tuir mai. Desde mayoria C/P participa ona iha PLUP durante fase 1, sira espera atu servisu mesak ho supervijaun no monitoring atividade.

**Tabela 9 Processo Implementasaun no Kontiudu PLUP**

Processu implementasaun	Kontiudu
Forma grupo servisu Vijita	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forma grupo servisu nebe implementa PLUP</li> <li>• Formulasaun planu servisu</li> <li>• Visita ba suku nebe halo regulamentu kona ba jestaun rekursu</li> <li>• Diskussaun ho chefi suku</li> </ul>
Formulasaun mapa uja rai agora	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forma mapa uja rai agora no uja foto areal</li> <li>• Konfirma balija suku no ema nia hela fatin</li> <li>• No mos rekursu natural importante ba iha mapa</li> </ul>
Formulasaun planu uja rai futuro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfirmasaun rekursu natural iha uja rai agora</li> <li>• Avalia importancia hosi rekursu</li> <li>• Analija kauja hosi degradasaun hosi floresta, rai, no natural rekursu seluk</li> <li>• Atividade nebe iha licensa ba kada devijaun rai inklui area floresta</li> <li>• Precisa troka iha balija ba uja rai agora</li> </ul>
Diskussaun regulamentu suku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reve opsaun ba uja rai</li> <li>• Discussaun opsaun adisional ba uja rai futuro</li> <li>• Regulamentu relasiona ba rekursu natural no uja rai.</li> <li>• Preparasaun institucional ba jestaun rekursu natural iha suku</li> <li>• kastigut</li> <li>• regulaentu seluk karik iha</li> </ul>
Konsultasaun ba to Aldeia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Explikasaun mapa uja rai futuro no regulamentu ba Aldeia</li> <li>• Entrevista ho ema nebe hela ba</li> </ul>
Finaliza regulamentu suku no planu uja rai futuro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajusta no finalija planu uja rai futuro (mapa) iha suku</li> </ul>

Processu implementasaun	Kontiudu
Apresentasaun planu ba NDFWM no edeficiu postu administrativu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantein approvasaun kona ba regulamentu no mapa uja rai</li> </ul>
Ceemonia tradisional (Tara Bandu)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organiza cerimonia tradisional bolu Tara Bandu no konvida parte nebe iha relasaun iha besik suku</li> </ul>

[3-1-3] Atu facilita residencia local atu formula regulamentu suku

Regulamentu suku sei halo hanesan parte hosi atividade PLUP. Depois organija Tara Bandu, Projeto sei assiste suku halao encontro regular atu resolve issu ruma nebe mosu durante implementasaun hosi regulamentu. Processo sei promove komprensaaun hosi lider suku kona ba efetividade hosi regulamentu suku no hasae sira nia capacidade ba jestaun rekursu natural. No mos, Projeto sei halo diak ba funcioana hosi koncelho jestaun bacias hidrografikas no fornese oportunidade ba lider suku atu troka esperiencia no konhecementu ba malu.

[3-1-4] Atu assiste residencia local atu identifika no hili MP nebe sei implementa

Tuir planu uja rai nebe formula ona iha atividade 3-1-2 no 3-1-3, Projeto sei assiste suku hili programa mikro (MPs). Inisiativa hili sei fo ba ema iha suku no Projeto no ONG sei fornese supporta tekniku.

**Tabela 10 Programa mikro nebe espera**

Lista hosi programa mikro
<ul style="list-style-type: none"> <li>Produsaun ai oan no Programa mikro kuda ai oan (SPTPP-MP)</li> <li>Promosaun toos foho lolon nebe sustentabel (SUFPP-MP)</li> <li>Programa mikro Habelar fini baseia ba comunidade (CBSE-MP)</li> <li>Programa mikro uja toos permanente nebe sustentabel (SUB/PF-MP)</li> <li>Hasae rendementu/desenvolve vida moris (IG/LA-MP)</li> </ul>

[3-1-5] Facilita Implementasaun Programa Mikro

Projeto, liu hosi ONG sub kontratu, sei facilita implementasaun programa mikro. Tabela tuir mai sumario hosi servisu preparasaun ba implementasaun programa mikro. Hanesan parte hosi preparasaun, projeto sei organija halao vijita, nebe ema sei vijita suku nebe besik nebe supporta ona hosi faje 1, atu nune hasae sira nia komprensaaun kona ba preocessu hosi programa mikro no ninia resultadu.

**Tabela 11 Preparasaun ba Implementasaun PM**

Atividade	Kontiudu	Notas
Forma grupo targetu	Forma grupo hosi participante sira no determina funsaun hosi kada membro iha grupo	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Importante atu hili membru diferente ba kada programa mikro atu nune lori impaktu posetivu ba comunidade hotu</li> <li>➤ Precisa prepara akordu eskrita nebe indika naran hosi membro sira no sira nia responsabilidade atu nune hasae sira nia responsabilidade no komitmentu</li> </ul>
Halao vijita	Visit a ba suku besik nebe implementa ona programa mikro	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Importante atu organija encontro feedback, depois vijita, atu fahe resultadu hosi vijita entre comunidade/membro sira iha suku</li> </ul>
Formasaun planu implementasaun ba Programa mikro	Atu halao workshop no determina atividade hosi programa mikro no planu hotu ba implementasaun	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Importante atu klarifika periodo implementasaun, funsaun hosi kada participante nebe espera resultadu</li> <li>➤ Precisa atu hetan approvasaun hosi suku kona ba planu implementasaun no fahe entre comunidade sira</li> </ul>

[3-1-6] Atu monitor observasaun regulamentu suku no implementasaun PM

Projeto sei assiste suku halao encontro regular ho lider suku atu diskuti issu nebe akontese no resolve sira tuir regulamentu. Aktividade nee sei organija hosi ONG, maibe projeto (C/P no peritus JICA) sei mos participa iha encontro atu fornese advise tekniku nebe precisa. C/P nebe participa iha monitoring sei apresenta resutladu ba seluk banhira sira fila ba edeficiu, esemplu, iha okasiaun hosi encontro seminal. nee sei promove fahe informasaun entre DNFGBH no facilita nia kapacidade ba prepara relatoriu official.

Tamba nee Projeto fase 1 lao diak iha halo grupo target hodi hetan beneficiu hosi IG/LA-MP (esemplu kripik aifarina no produsaun cha). Projeto faje segundu sei kontinua mos esforsu nee ho esplora necesidade merkadu hosi produto hirak nee no seluk karik konsidera iha kompetisaun iha merkadu.

[3-2] Facilita estabelementu no operasaun hosi koncelho jestaun bacias hidrgrafikas iha fatin projeto

[3-2-1] Atu reve performancia hosi koncelho jestaun bacias hidrografikas atu analija ninia necesidade no efetividade

Projeto sei reve performancia nebe halo iha koncelho jestaun bacias hidrografikas Noru dese hari too agora iha kolaborasaun ho membro koncelho. Liliu, kona ba akontecementu atividade illegal iha suku balija no resposta hosi koncelho ba problema hanesan nee sei konfirma atu nune hare fali efetividade hosi koncelho. Funsau hosi encontro regular mos sei monitor.

[3-2-2] atu hare no introdus karik buat balun nebe atu hadia hosi koncelho jestaun bacias hidrografikas Noru

Projeto sei diskuti ho ONG kona ba problema no obstaklu nebe identifika iha atividade leten [3-2-1] no buka solusaun ba problema atu mitiga problema. Resutladu hosi diskussaun sei apresenta hosi C/P iha encontro regular hosi koncelho atu fahe ho membro koncelho sira.

[3-2-3] Atu monitor atividade hosi koncelho jestaun bacias hidrografikas Noru

Projeto sei participa iha encontro regular hosi koncelho ho ONG no fornese matadalan no advise tekniku konaba jestaun rekursu natural iha bacias hidrografikas.

[3-2-4] atu konsulta ho autoridade governo local iha sub bacias hidrgrafikas Bemos atu sensitija sira kona ba CB-NRM

Projeto sei introdus CB-NRM ba edeficiu administrative Laurala no MAP municipiu Aileu. Atu facilita sira nia komprensau kona ba koncelho jestaun bacias hidrografikas no mos funsau hosi governo local, susessu hosi koncelho Noru sei apresenta. Manual no leaflet desenvolve ona iha faje lsei mos parte hosi material ba sira nia facilitasau.

[3-2-5] Atu halao vijita no analija parceiru atu hili membro sira hosi koncelho jestaun bacias hidrografikas iha bacias hidrografikas Bemos

Projeto sei organija vijita ba lider suku no officias administrativu hosi postu administrasaun ba vijita suku nebe supporta hosi faje 1 ho obetivu atu hasae komprensau funsau hosi koncelho.

Ho supporta hosi ONG, lider suku sei determina komposisaun hosi jestor bacias hidrografikas. Projeto sei analija funsaun hosi koncelho jestaun bacias hidrografikas no depois hili kandidatu ba membro sira. Tabela tuir mai lista kandidatu hosi koncelho Jestaun bacias hidrografikas Bemos.

**Tabela 12 membro nebe propoin hosi koncelho jestaun bacias hidrografikas Bemos**

Grupo	Membro nebe propoin
Ema iha suku	Lider hosi suku lima iha bacias hidrografikas Bemos (Dare, Tohumeta, Talitu, Cotolau, Madabeno )
Officias Administrativu local	Chefi departamentu ambiente iha Aileut Administrador postu administrasaun Laurala Chefi departamentu bee no saniamentu postu administrative Laurala
Officias MAP	Chefi departamentu DNFGBH, jestor DNFGBH, director MAP Aileu

[3-2-6] Atu halao analija situasaun atu hare ba vijaun komun hosi sub bacias hidrografikas Bemos

Ho assistencia hosi Projeto, ONG sei halo analija situasional atu klarifika vijaunno objetivu hosi koncelho Bemos. Projeto sei offerese foto aerial iha nivel suku no halo sira uja hodi analija. No mos, mapa floresta iha nivel municipiu, nebe desenvolve hosi projeto ba Planu konservasaun floresta, sei refere iha konfirmasaun hosi kobertura floresta.

[3-2-7] Atu formula lei no resulusaun hosi koncelho jestaun bacias hidrografikas Bemosl

Projeto sei supoorta formulasaun lei no resulusaun hosi koncelho jestaun bacias hidrografika Bemos ba jestaun no operasaun nebe propriu. Ho fahe sampel dokumentus hosi koncelho Noru, nee sei ajuda membro koncelho sira atu iha hanoin nebe klaru kona ba kontiudu hosi dokumentu. Dokumentu resulusaun sei indika lista hosi membro sira no sira nia funsaun no mos vijaun no missaun hosi koncelho, tuir instrusaun hosi manual ba formulasaun koncelho jestaun bacias hidrografikas.

[3-2-8] Atu facilita koncelho atu formula koncelho jestaun bacias hidrografikas Bemos

Projeto sei assiste koncelho halo encontro regular ba monitoring atividade. Sei fornese ideas kona ba operasaun no jestaun koncelho hare assuntu tekniku kona ba jestaun rekursu natural.

Nomos, sei supporta formulasaun planu jestaun bacias hidrografikas, nebe hare ba matadalan principal kona ba jestaun rekursu natural iha bacias hidrografikas. Ho referencia ba planu ba sub bacias hidrografikas Noru, koncelho desenvolve planu ba Bemos. Processo hosi planu nee, ninia sumario hanesan tui mai.

**Tabela 13 Planu encontro ba formulasaun planu jestaun bacias hidrografikas**

Encontro	Proposed agenda
Encontro premeiru	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Esplika objetivu no idea jeral hosi planu jestaun bacias hidrografikas</li> <li>➤ Fahe planu jestaun bacias hidrografikas hosi bacias hidrografikas Noru</li> </ul>
Encontro segundu	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Introdusaun planu jestaun bacias hidrografikas ba sub bacias hidrografikas Bemos</li> <li>➤ Status hosi sub bacias hidrografikas Bemos</li> </ul>
Encontro terceiru	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Problema no obstaklu kona ba jestaun bacias hidrografikas</li> <li>➤ Metas no Objetivu hosi planu</li> </ul>
Enkontru dala hat	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Idea Jeral hosi planu jestaun bacias hidrografikas</li> <li>➤ Implementasaun planu ba jestaun bacias hidrografikas</li> </ul>
Encontro dala lima	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Resolusaun nebe propoin ba hatama planu</li> <li>➤ Halo esbosu planu jestaun bacias hidrografikas</li> </ul>
Encontro dala neen	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Finaliza resulusaun no hatama</li> <li>➤ Hatama planu jestaun bacias hidrografikas</li> </ul>



[3-2-9] Atu monitor atividade hosi koncelho jestaun bacias hidrografikas Bemos

No mos ba koncelho Noru nian, Projeto sei participa iha enkontro regular ho koncelho Bemos ho ONG no monitor atividade.

[3-3] Halao OJT ba autor operacional importante no fatin laos projeto liu hosi implementasaun mekanismu CB-NRM iha 3-1 no 3-2 iha leten

[3-3-1] atu hili autor operasaun importante nebe sei participa iha OJT

Projeto sei hili participante sira ba OJT liu hosi konsultasaun ho NDFWM no ONG sub kontratu ONG. Kona ba selesaun, Projeto sei diskuti ho DP (hanesan USAID no DFAT) no ONG sira atu identifika necessidade ba desenvolve kapacidade no kandidatu ba ema nebe tuir treina. Kriteria selesun basiku sei inklui kontinuasaun participasaun iha OJT ho komitmentu hotu ba servisu nebe foo no planu konkretu ba servisu hanesan facilitador hosi CB-NRM iha sira nia area operasaun. Preferencia sei foo ba jersaun foun tuir sira nia profesaun.

Hanesan mensiona iha atividade [3-1], mekanismu CB-NRM sei halo servisu ba fase rua. No mos, OJT sei sei offerese ho okasiaun rua, atu nune involve autor barak liu. Banhira plataforma estabese ona, kandidatu ba OJT sei rekruta tuir sirklu plataforma.

[3-3-2] Atu halo preparasaun necessariu hodi hili autor nebe hola parte iha OJT

Projeto sei halo preparasaun hanesan tuir mai ba hili participante sira atu simu OJT.

- Introdus ba participante sira kona ba ONG sub kontratu: Desde ONG sub kontratu sei organija OJT, participante sira sei precisa atu kompende historia no politika hosi ONG no fahe objetivu hosi OJT entre parte rua.
- Konfirmasaun processo hosi OJT ho ONG sub kontratu: inklui horariu atividade no OJT, servisu demarkasaun entr facilitador premeiru no sub facilitador (esemplu ema nebe tuir OJT) no hirak nebe aprende hosi atividade.
- Konfirmasaun hosi lojstika: inklui fahe kustu entre ONG no ema nebe tuir treinamentu, procedur no regulamentu ba despesas nebe halo hosi ONG, no material necessariu ba OJT
- Introdusaun ema nebe fo treina ba suku target no organijasaun relevante: Projeto sei introdus ba ema nebe tuir treinamentu no esplika objetivu hosi OJT. No mos, sei ajuda atu buka kolaborador nebe potensial ou doador nebe bele supporta atividade hosi ema nebe tuir treinamentu depois remata OJT. Ema nebe tuir treina sei introdus ba HASATIL no DP nebe servisu iha suku targetu.
- Preparasaun ba avliadasun OJT (esemplu checklists ba progresso ho komprensaun no uja papel feedback): Projeto sei simu mos feedback hosi ema nebe tuir treina kona ba processo hosi OJT no avalia progreso hodi desenvolve ninia kapacidade.

[3-3-3] Atu halao OJT ho implementasaun mekanismu CB-NRM

Ema nebe tuir treina sei participa, hanesan sub facilitador, iha processo implementasaun CB-NRM iha supervijaun hosi facilitador premeiru.

[3-3-4] Atu reve processo hosi OJT

Projeto sei reve proceso hosi OJT ho referencia ba feedback hosi ema nebe tuir treina no assessu ninia capacidade nebe desenvolve baseia ba checklist. Revijaun sei identifika fatin atu hadia intermus administrativu no aspeitu tekniku. Nomos karik iha feedback ruma hosi ema nebe tuir treina ba fatin/simplifika hosi CB-NRM, Projeto sei tau iha konsideasun no usa sira ba espansaun mekanismu CB-NRM iha futuru.

[3-3-5] Atu akomoda informasaun kona ba autor operasaun importante nebe kompleta OJT atu tau hamutuk sira ba iha lista hosi rekursu humanu ba CB-NRM

Projeto sei prepara lista rekursu humanu, akomoda autor nebe kompleta OJT. Lista sei detailhu tuir informasaun. Banhira mantein rekonhecementu hosi ema nebe lista iha publikasaun, Projeto sei fahe informasaun ho parceiro oin oin iha plataforma CB-NRM. Karik nia buka servisu atu servisu hanesan facilitador CB-NRM, Projeto sei koko hare ho DP no ONG nebe refere.

**Tabela 14 Esbosu kontiudo hosi Lista Rekursu Humanu CB-NRM**

Seksasun	Detailhu
Informasaun basiku	Naran, jeneru, organijasaun, informasaun kontaktu
OJT participasaun	Nivel presence no resultadu hosi checklist ba komprensaun
Fundamentu akademiku Esperiencia servisu	Fundamentu akademiku no dever hosi servisu uluk nian
Kondisaun servisu nebe prefere	Preferred work location, duties and other condition

### 3.6 Horariu Servisu

Horariu servisu hosi atividade Projeto hatudu iha figura 8 hanesan aneksu iha dokumentu nee.

## 4. Equipamentu nebe atu hola

Tuir mai ekipamentu nebe sei fornese ba Projeto

Equipamentu nebe uja hosi Ekipa Projeto, nebe sei foo ba MP depois projeto remata

- Laptop PC (unit 3)
- Desktop PC (unit 2)
- Printer multifunsaun (unit 1)
- Laser printer (unit 1)

Equipamentu uja hosi MAP ba implementasaun Projeto

- Motor (unit 4)

## 5. Relatoriu no Dokumentu seluk nebe sei produs

Tabela tuir mai relatoriu nebe sei prepara hosi Projeto

**Tabela 15 Relatoriu**

Relatoriu	Tempu hatama	Numero kopia
Planu servisu	Outubro 2016	English: 3 Tetun: 14 CD-R form: 1
Papel Monitoring Ver.1	Outubro 2016	English: 3 Japanese:3 Tetun: 14
Papel Monitoring Ver.2	Marsu 2017	
Papel Monitoring Ver.3	Setembro 2017	
Papel Monitoring Ver.4	Marsu 2018	
Relatoriu Interim	Abril 2018	
Papel Monitoring Ver.5	Setembro 2018	
Papel Monitoring Ver.6	Marsu 2019	
Papel Monitoring Ver.7	Sptembro 2019s	
Papel Monitoring Ver.8	Marsu 2020	English: 5 Japanese: 5 Tetun: 14 CD-R form: 3 for each language
Relatoriu final projeto	Augusto 2020	

Nomos tuirmai dokumentu nebe sei prepara iha kursu implementsaun projeto.

- Planu assaun espansaun CB-NRM (iha English no Tetun)
- Rekomendasau politika ba period depois 2019
- Lisaun no pratika diak hosi implementasaun CB-NR (iha English no Tetun)
- Lista hosi autor operaun importante ba implementasaun CB-NRM (iha English no Tetun)
- Material seluk (e.g.relatoriu tekniku no material apresentasaun)

